



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0202387/2026-GAP

Resposta do Executivo 195/2026

Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01

A Sua Excelência o Senhor
Fábio Fernando Siqueira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: **Requerimento nº 214/2026-SO, de autoria do Vereador Amauri Carlos Caboclo.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº3535507.414.00008310/2026-34

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações detalhadas sobre a execução, medições, pagamentos e fiscalização das principais obras públicas contratadas e em andamento no município, segue em anexo o Ofício nº 057/2026, com informações da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação e segue Despacho Resposta com informações da Assessoria em Gestão de Licitações.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

Referência: Processo nº 3535507.414.00008310/2026-34

SEI nº 0202387



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 057/2026

Paraguaçu Paulista, 14 de agosto de 2026.

DE: Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação

PARA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

ASSUNTO: REQUERIMENTO 214/2026-SO - VEREADOR AMAURI CARLOS CABOCLO

Em atenção ao requerimento 214/2026-SO, por meio do qual o vereador Amauri Carlos Caboclo, requer informações detalhadas sobre a execução, medições, pagamentos e fiscalização das principais obras públicas contratadas e em andamento no município, encaminho anexo resposta do Arquiteto Marco Antonio Martins, 0205659, 0205705, 0205706, 0205707, 0205719.

Encaminho anexo resposta da Arquiteta Hellen Isabella do Nascimento, 0205725, 0205910, 0205912, 0205915 e 0205917.

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO HIPÓLITO FERREIRA
Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação



Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Hipólito Ferreira, Secretário Municipal, em 14/08/2026, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0204178** e o código CRC **D96CB31F**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00008354/2026-64

SEI nº 0204178

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Assessoria de Departamento

DESPACHO

Nº do Processo: 3535507.414.00008354/2026-64

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

Assunto: Requerimento(s) nº 209, 213 e 214 de 2026 - SO

RESPOSTA PARA REQUERIMENTO DE SESSÃO 214/2026

1. Quais são todas as obras públicas contratadas com empresas terceirizadas que se encontram em execução no município na presente data, discriminando o valor global de cada contrato e a respectiva origem dos recursos (recursos próprios, emendas parlamentares ou convênios), bem como o prazo de execução de cada uma? Relacionar.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PORTE V, NO RESIDENCIAL VILLE DE FRANCE

A obra refere-se à construção de uma Unidade Básica de Saúde – UBS Porte V, localizada no Residencial Ville de France, objeto do Contrato nº 006/2026, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 001/2026, firmado com a empresa Doná Incorporações Ltda.-EPP.

O valor contratado é de **R\$ 6.077.901,82**.

Os recursos são provenientes do Governo Federal, no âmbito do **Novo PAC**, vinculados à Proposta nº 11909.9740001/25-007, convênio de R\$ 5.214.000,00, complementados por recursos próprios do Município.

O prazo contratual de execução é de **18 meses, contados da emissão da Ordem de Serviço**. Até a data dos documentos analisados, a obra encontra-se em execução regular e dentro do prazo contratual.

CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NA AVENIDA HISSAGY MARUBAYASHI

A obra de construção da Ciclovia na Avenida Hissagy Marubayashi encontra-se em execução, sob responsabilidade da empresa **NOROMIX CONCRETO S/A**, inscrita no CNPJ nº 10.558.895/0001-38, contratada por meio da Concorrência Eletrônica nº 007/2025, Processo Administrativo nº 168/2025 e Contrato nº 042/2025.

O valor global contratado é de R\$ 989.851,63. A obra é executada com recursos provenientes do Convênio SJC/FID nº 211/2025, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos - FID, e contrapartida financeira do Município. Do valor contratado, aproximadamente R\$ 772 mil correspondem aos recursos estaduais e R\$ 217 mil à contrapartida municipal.

O prazo contratual de execução é de 360 dias, contados da emissão da Ordem de Início, assinada em 13 de novembro de 2025, ressalvadas eventuais alterações ou prorrogações formalmente autorizadas.

2. Quem são os engenheiros ou fiscais de contrato nomeados pela Prefeitura para acompanhar tecnicamente a execução de cada uma dessas obras contratadas? Relacionar por responsável

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PORTE V, NO RESIDENCIAL VILLE DE FRANCE

- **Marco Antonio Martins**, arquiteto e urbanista, CAU/SP nº A189485-4;
- **Edi José da Silva**, arquiteto e urbanista, CAU/SP nº A189488-9.

CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NA AVENIDA HISSAGY MARUBAYASHI

- **Marco Antonio Martins**, arquiteto e urbanista, CAU/SP nº A189485-4;
- **Edi José da Silva**, arquiteto e urbanista, CAU/SP nº A189488-9.

A obra também conta com o acompanhamento da empresa **F.S. Projetos Ambientais Ltda. EPP**, contratada para realização de auditoria independente e auxílio no acompanhamento da licitação, das medições, da execução e do recebimento final da obra, representada tecnicamente pelo engenheiro civil **Edson Geraldo Sabbag Junior**, CREA/SP nº 5061405394.

3. Houve a emissão de boletins de medição e a efetivação de pagamentos recentes para essas empresas? Em caso afirmativo, qual é o percentual físico executado e o percentual financeiro pago de cada obra em andamento até o momento? Relacionar por obra com porcentagens solicitadas

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NA AVENIDA HISSAGY MARUBAYASHI

Consta pagamento de R\$ 20.577,29 à contratada, equivalente a aproximadamente 2,08% do valor global do contrato.

Fisicamente, estima-se que tenha sido executado aproximadamente 32% da obra, percentual que ainda não foi integralmente pago. A fiscalização solicitou a apresentação dos memoriais de calculo, relatório fotográfico e diário de obra, a fim de possibilitar a consolidação segura da evolução física e financeira. Como a empresa não apresentou tais documentos de forma completa e com a exatidão necessária quanto aos serviços efetivamente executados, a medição foi indeferida, permanecendo, até o momento, apenas uma medição realizada de 2,08 % da obra.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PORTE V, NO RESIDENCIAL VILLE DE FRANCE

Até o momento foram elaboradas três medições da obra.

- Valor acumulado medido: **R\$ 1.209.309,00;**
- Percentual acumulado de execução física: **19,90%;**

4. Alguma das obras contratadas apresenta atraso em relação ao cronograma inicial estabelecido em contrato? Se sim, quais foram as justificativas apresentadas pelas empresas? Quais penalidades foram aplicadas pela atual gestão pelas irregularidades? Relacionar por obra com o nome de cada empresa responsável.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NA AVENIDA HISSAGY MARUBAYASHI

A obra apresentou atrasos e períodos de paralisação em relação ao cronograma inicialmente previsto.

A Ordem de Início foi assinada em 13 de novembro de 2025. Em 5 de dezembro de 2025, a Administração cobrou formalmente a mobilização da empresa. Na mesma data, a contratada solicitou o adiamento do início dos serviços para 5 de janeiro de 2026, alegando o período de festas de fim de ano e as condições climáticas.

Como não houve mobilização na data indicada, foram realizadas novas cobranças e, em 19 de janeiro de 2026, foi expedida a 1ª Notificação Administrativa, concedendo prazo de três dias para início dos serviços. A pertinência dessa notificação foi confirmada pela empresa responsável pela auditoria independente.

Posteriormente, após o início da execução, foi constatado novo período de paralisação. Embora a fiscalização tenha reconhecido as interferências climáticas efetivamente verificadas em determinadas etapas, constatou-se período aproximado de 21 dias consecutivos sem chuvas e sem retomada dos serviços. Em razão disso, foi expedida, em 7 de julho de 2026, a 2ª Notificação Administrativa, determinando o reinício efetivo da obra no prazo de cinco dias corridos, com mobilização de equipe.

Até os documentos analisados, não consta aplicação de penalidade administrativa definitiva. As notificações constituem providências formais de fiscalização e oportunidade de regularização, mas não se confundem com sanção administrativa. A segunda notificação consignou que eventual novo descumprimento poderá ocasionar a instauração de Processo Administrativo Sancionador, aplicação das penalidades contratuais.

5. A administração municipal possui relatórios de vistoria técnica atualizados para cada um desses canteiros de obras? Em caso afirmativo, requer-se o envio de cópias dos referidos documentos. Em caso negativo, justifique a falta de acompanhamento documentado.

Em anexos relatorios das obras da construção da ciclovia na Avenida Hissagy Marubayashi e construção da unidade básica de saúde – UBS porte V, no Residencial Ville de France.

6. Existem obras no Município que tiveram abandono ou rescisão contratual e que necessitam ou já tiveram nova licitação providenciada? Relacionar as obras, o motivo do abandono e informar se houve ou quando haverá novo processo licitatório.

Sim. Foram identificadas as seguintes obras cujos contratos foram encerrados sem a conclusão integral dos serviços:

a) Reforma da EMEI Beija-Flor

A empresa contratada abandonou a execução da obra, tendo sido formalmente notificada por duas vezes durante a vigência contratual. A obra foi executada com recursos próprios municipais. No momento, não há previsão para realização de nova licitação.

b) Reforma e Ampliação da EMEF Coronel Antônio Nogueira

A empresa contratada abandonou a execução da obra, tendo sido formalmente notificada por duas vezes durante a vigência contratual. A obra foi executada com recursos próprios municipais. No momento, não há previsão para realização de nova licitação.

c) Construção de Unidade de Saúde no Conjunto Habitacional Dona Lina Leuzzi

A empresa contratada foi formalmente notificada por quatro vezes durante a execução da obra. O contrato foi encerrado sem que os serviços fossem integralmente concluídos e, atualmente, a obra encontra-se paralisada.

A execução é vinculada a convênio celebrado com a **Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo**. O Município aguarda a liberação do respectivo processo no sistema **Sem Papel**, para inclusão e atualização dos documentos necessários. Após essa liberação e a regularização documental do convênio, será instaurado novo processo licitatório para a conclusão da obra.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0205659** e o código CRC **545556F8**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00008354/2026-64

SEI nº 0205659

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

 DONÁ INCORPORAÇÕES LTDA				Relatório nº	1
				Data do relatório	27/03/2026
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	9 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	541 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (2)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Carlos Doná	Engenheiro Civil	08:00 - 12:00		04:00	Mão de Obra Direta
Adrielly Freitas	Eng. Civil	08:00 - 14:00	00:00	06:00	Mão de Obra Indireta

Atividades (1)	
Reunião inicial de obra	Concluída

Fotos (9)





Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	2	
				Data do relatório	04/05/2026	
				Dia da semana	Segunda-Feira	
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato		
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias	
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	47 dias	
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas		Prazo a vencer	503 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀️ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (1)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Carlos Doná	Engenheiro Civil	08:00 - 12:00		04:00	Mão de Obra Direta

Ocorrências (1)
Foi Solicitado Fiscal Marco Martins, para que a prefeitura e retirada dos tubos para inicio da limpeza e movimentação do solo dentro do terreno.

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	3
				Data do relatório	05/05/2026
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	48 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	502 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (1)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Carlos Doná	Engenheiro Civil	08:00 - 12:00		04:00	Mão de Obra Direta

Ocorrências (2)
Prefeitura deu inicio da retirada dos tubos.
Definido os pontos do ensaio de solo. Todos estão todos perto das zonas dos pilares que vão distribuir a maior carga para o solo. P105 - 36,2 Tf P121 - 25,5 Tf P118+123 - 24 Tf P96 - 15 Tf P7 - 16 Tf

Fotos (1)	
	
Definido os pontos do ensaio de solo.	

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

 DONÁ INCORPORAÇÕES LTDA				Relatório nº	4
				Data do relatório	06/05/2026
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	49 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	501 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (1)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Carlos Doná	Engenheiro Civil	08:00 - 12:00		04:00	Mão de Obra Direta

Comentários (1)	
Engº Carlos Doná 06/05/2026 14:38 Em reunião com o Fiscal Marco Martins, ficou decidido que vai tapumar só a frente. Fechado o serviço de maquina para regularização do terreno, so inicia daqui 10 dias, previsão de 3 dias de serviço, porem ainda vou tentar fechar com o pessoal do loteamento aqui mesmo. A terra excedende esta sendo retirada pela empresa do loteamento, em seguida saira os tubos. Marcado onde vai ser executado o ensaio de solo conforme o projeto em anexo do dia 05/05/2026.	

Fotos (2)	
	

Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:27
Vídeo 2 (visualizar).mp4	01:00

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

Assinatura

Assinatura

 DONÁ INCORPORAÇÕES LTDA				Relatório nº	5
				Data do relatório	07/05/2026
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	50 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	500 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀️ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (1)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Carlos Doná	Engenheiro Civil	08:00 - 12:00		04:00	Mão de Obra Direta

Comentários (1)	
Engº Carlos Doná 07/05/2026 17:00 Dia 12/05 Agendado o ensaio de Solo.	

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

				Relatório nº	6
				Data do relatório	12/05/2026
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	55 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	495 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (1)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Carlos Doná	Engenheiro Civil	08:00 - 12:00		04:00	Mão de Obra Direta

Atividades (2)	
Ensaio de solo (SPT)	80% - Em Andamento
Retirada dos tubos de concreto	90% - Em Andamento

Comentários (1)	
Engº Carlos Doná 13/05/2026 09:00 Ligação de agua Solicitado Sabesp Ligação de esgoto solicitado energisa. Poste Trifasico comprado Caixa Sabesp de Agua e de Esgoto comprados	

Fotos (1)	
	

Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:08
Vídeo 2 (visualizar).mp4	01:00

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	7
				Data do relatório	19/05/2026
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	62 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	488 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (1)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Carlos Doná	Engenheiro Civil	08:00 - 12:00		04:00	Mão de Obra Direta

Atividades (2)	
Ensaio de solo (SPT)	100% - Concluída
Retirada dos tubos de concreto	100% - Concluída

Comentários (2)	
Engº Carlos Doná 21/05/2026 17:56 Energia Ligada. Padrão sabesp Executado	
Engº Carlos Doná 21/05/2026 18:09 O ensaio SPT Ficou pronto segue em Anexo. OBS. O projeto pede 1,00 Kg/cm² O solo está com 0,50 Kg/cm². Sugestão é FAzer o reforço com estacas de concreto armado na fundação	

Fotos (3)	
 Energia Ligada	 Padrão agua Executado

		Aldeira e Cietra	Victor de Medis	Dickran Berberian	Milton Vargas
Ponto	EST	$f_{s,0.01} = \frac{SPT}{10} \rightarrow kg/cm^2$	$f_{s,0.01} = \frac{SPT}{10} \rightarrow kg/cm^2$	$f_{s,0.01} = \frac{SPT}{10} \rightarrow kg/cm^2$	$f_{s,0.01} = \frac{SPT}{10} \rightarrow kg/cm^2$
SP-01	0	5.00	5.70	0.90	5.80
SP-02	0	5.00	5.70	0.90	5.80
SP-03	0	5.00	5.70	0.90	5.80
		media	5.70	0.90	
		variacao	5.00		

Calculo da capacidade do solo.

Anexos (1)	
Relatório do Ensaio SPT.pdf	472 KB

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

				Relatório nº	8
				Data do relatório	13/05/2026
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	56 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	494 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀️ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (1)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Carlos Doná	Engenheiro Civil	08:00 - 12:00		04:00	Mão de Obra Direta

Atividades (2)	
Ensaio SPT	Concluída
Retirada Tubos	Concluída

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

Assinatura

Assinatura

 DONÁ INCORPORAÇÕES LTDA				Relatório nº	9
				Data do relatório	20/05/2026
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	63 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	487 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (1)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Carlos Doná	Engenheiro Civil	08:00 - 12:00		04:00	Mão de Obra Direta

Equipamentos (4)					
Pá Carregadeira 1 07:00 - 18:00 (11h)	Trator esteira 1 07:00 - 18:00 (11h)	Caminhão BAsculante 15m³ 2 07:00 - 18:00 (22h)			

Atividades (1)	
Limpeza terreno e terraplanagem	20% - Em Andamento

Comentários (1)
Engº Carlos Doná 21/05/2026 18:03 Iniciou a Limpeza do terreno e o Corte e aterro. Foi Localizado um PV de Pluvial no meio do terreno

Fotos (2)	
 Inicio Limpeza terreno	 PV De Pluvial no meio do terreno.

Assinatura

Assinatura

 DONÁ INCORPORAÇÕES LTDA				Relatório nº	10
				Data do relatório	21/05/2026
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	64 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	486 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (1)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Carlos Doná	Engenheiro Civil	08:00 - 12:00		04:00	Mão de Obra Direta

Equipamentos (5)					
Pá Carregadeira 1 07:00 - 18:00 (11h)	Trator esteira 1 07:00 - 18:00 (11h)	Caminhão BAsculante 15m³ 2 07:00 - 18:00 (22h)	GPS Geodésico 1 07:00 - 11:00 (4h)		

Atividades (2)	
Limpeza terreno e terraplanagem	50% - Em Andamento
Georeferenciamento	100% - Em Andamento

Ocorrências (1)
Em Relação ao PV de Pluvial encontrado, o mesmo estava inutilizado. Problema resolvido e o PV retirado sem maiores problemas

Comentários (1)
Engº Carlos Doná 21/05/2026 18:18 Material do Tapume na Obra. Limpeza do terreno. Corte Aterro. Topografia

Fotos (2)

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Locando os pontos e definindo os níveis



2 Maquinas e Dois CAminhões de Bota Fora

Vídeos (2)		
Vídeo 1 (visualizar).mp4	Locando os pontos e definindo os níveis	00:19
Vídeo 2 (visualizar).mp4	2 Maquinas e Dois CAminhões de Bota Fora	00:18

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	11
				Data do relatório	22/05/2026
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	65 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	485 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (1)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
Carlos Doná	Engenheiro Civil	08:00 - 12:00		04:00	Mão de Obra Direta

Equipamentos (3)					
Pá Carregadeira 1 07:00 - 18:00 (11h)	Trator esteira 1 07:00 - 18:00 (11h)	Caminhão BAsculante 15m³ 1 07:00 - 18:00 (11h)			

Atividades (2)	
Limpeza terreno e terraplanagem	100% - Concluída
Tapume	40% - Em Andamento

Ocorrências (1)
Foi enviado no E-mail do Fiscal Marcos, os calculos para o reforço da fundação no aguardo para formalizar o serviço

Comentários (1)
Engº Carlos Doná 23/05/2026 09:58 Finalizada a terraplanagem e limpza terreno Início da instalação dos tapumes.

Fotos (11)	
 Instalação Tapume da Frente	 Movimentação terra Finalizado.

	
Movimentação terra Finalizado.	Movimentação terra Finalizado.
	
Movimentação terra Finalizado.	Movimentação terra Finalizado.
	
Movimentação terra Finalizado.	

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

 Movimentação terra Finalizado.	 Corte - 1,60
 Aterro - 1,90	

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	12	
				Data do relatório	25/05/2026	
				Dia da semana	Segunda-Feira	
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato		
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias	
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	68 dias	
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas		Prazo a vencer	482 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (4)						
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 2	Encarregado de Obras 1					Terceiros (3)

Atividades (1)	
Tapume	45% - Em Andamento

Fotos (1)	
	

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	13
				Data do relatório	26/05/2026
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	69 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	481 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (4)						
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 2	Encarregado de Obras 1					Terceiros (3)

Atividades (2)	
Tapume	45% - Em Andamento
LOCAÇÃO DE OBRA	20% - Em Andamento

Fotos (1)	
	
Locação do Gabarito	

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

 DONÁ INCORPORAÇÕES LTDA				Relatório nº	14
				Data do relatório	27/05/2026
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	70 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	480 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀️ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (4)						
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 2	Encarregado de Obras 1					Terceiros (3)

Atividades (3)	
Tapume	52% - Em Andamento
LOCAÇÃO DE OBRA	80% - Em Andamento
Canteiro Obras	20% - Em Andamento

Comentários (1)	
Engº Carlos Doná 28/05/2026 10:41 Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc. BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m Em execução	

Fotos (4)	
 Locação do canteiro	 Material para o canteiro



Bebedouro



Gabarito

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	15
				Data do relatório	28/05/2026
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	71 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	479 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (6)						
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 2	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Pintor 1			Terceiros (5)

Atividades (3)	
Tapume	52% - Em Andamento
LOCAÇÃO DE OBRA	60% - Em Andamento
Canteiro Obras	20% - Em Andamento

Comentários (2)	
Engº Carlos Doná 28/05/2026 10:58 Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc. BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m Em execução	
Engº Carlos Doná 28/05/2026 11:06 Chegaram - Container Escritório; - Container Almoxarifado.	

Fotos (1)

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/public/materiallegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Container Escritório

Assinatura

Assinatura

 DONÁ INCORPORAÇÕES LTDA				Relatório nº	16
				Data do relatório	29/05/2026
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	72 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	478 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (6)						
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 2	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Pintor 1			Terceiros (5)

Atividades (4)	
Tapume	67% - Em Andamento
LOCAÇÃO DE OBRA	100% - Concluída
Canteiro Obras	100% - Concluída
Terraplanagem	100% - Concluída

Fotos (5)	
	
Locação da Obra Finalizado	

	 Containers já em Obra
	

				Relatório nº	22
				Data do relatório	09/06/2026
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	83 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	467 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (13)						
Pedreiro 3						Mão de Obra Direta (3)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 7	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1				Terceiros (9)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	32% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	11% - Em Andamento
22. EXTERNO	17% - Em Andamento

Comentários (4)	
Caroline Santos 09/06/2026 08:13 LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06	
Caroline Santos 10/06/2026 14:09 Hoje pela manhã 09/06/2026 chegaram 8m³ de concreto! Recapitulando: 05/06 sexta chegaram 7m³ 25 estacas e 2 carrinhos 06/06 sábado foram 16m³ 08/06 segunda- feira foram 8m³ 31 estacas São 218 estacas de 6 metros com diâmetro de 25cm	
Caroline Santos 09/06/2026 15:20 Visita do fiscal Edi	
Caroline Santos 09/06/2026 17:01 Pela manhã chegaram 50 tábuas Na parte da tarde chegaram 30 tábuas Também chegaram materiais para o canteiro de obras	

Fotos (32)



Enchimento das estacas



Ensaio corpo de prova



Ensaio corpo de prova



Descarregamento de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Descarregamento de concreto



Caminhão de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Corte do pvc para corpo de prova



Chegada das tábuas pela manhã



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

Canteiro de obras

Canteiro de obras



Canteiro de obras





Vídeos (8)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4 Descarregamento de concreto	00:39
Vídeo 2 (visualizar).mp4 Corpo de prova	00:14
Vídeo 3 (visualizar).mp4 Corpo de prova	00:01
Vídeo 4 (visualizar).mp4 Descarregamento de concreto	00:32
Vídeo 5 (visualizar).mp4 Descarregamento de concreto	01:00
Vídeo 6 (visualizar).mp4 Enchimento das estacas	00:06
Vídeo 7 (visualizar).mp4	00:07
Vídeo 8 (visualizar).mp4	00:02

Carlos Dona

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	23
				Data do relatório	10/06/2026
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	84 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	466 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☁ Nublado	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☔ Chuvoso	Praticável

Mão de obra (13)						
Pedreiro 3						Mão de Obra Direta (3)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 7	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1				Terceiros (9)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	33% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	12% - Em Andamento
22. EXTERNO	18% - Em Andamento

Comentários (2)	
Caroline Santos 10/06/2026 07:04 LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06	
Caroline Santos 10/06/2026 16:05 Tempo parcialmente nublado pela manhã sem chuvas Caminhão de concreto 8m³ Chegaram somente o restante dos sarrafos Foram solicitados: 4 Tomadas externa 10 A 1 Tomada externa 20 A 40 m de cabo 6mm 20 m de cabo 2,5 E já chegaram! Na parte da tarde, continuou nublado e início de chuva Caminhão de concreto com 7m³ Cálculo das tubulações AF finalizado Visita dos fiscais Marco Arquiteto, Edi Arquiteto e Engenheiro Luiz Fernando Foram preenchidas 37 estacas	

Fotos (38)



Canteiro de obras



Descarregamento de concreto



	 Chegada do caminhão de concreto
 Chegada do caminhão de concreto	 Lacre do caminhão de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Chegada dos somente dos sarrafos



Chegada dos somente dos sarrafos



Estacas



Enchimento das estacas



 Enchimento das estacas	 Bate estaca
 Enchimento das estacas	 Enchimento das estacas



Lacre do caminhão de concreto- a tarde



Lacre do caminhão de concreto- a tarde



Lacre do caminhão de concreto- a tarde



Lacre do caminhão de concreto- a tarde



Bate estaca



Descarregamento de concreto



Lacre do caminhão de concreto- a tarde



Lacre do caminhão de concreto- a tarde



Lacre do caminhão de concreto- a tarde



Corpo de prova- de manhã





Corpo de prova- a tarde



Canteiro de obras



Canteiro de obras



Canteiro de obras



Canteiro de obras

Vídeos (5)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:08
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:02
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:04
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:06
Vídeo 5 (visualizar).mp4	00:37



Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	24
				Data do relatório	11/06/2026
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	85 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	465 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☁ Chuvoso	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável


Mão de obra (12)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 6	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 1			Terceiros (9)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	34% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	13% - Em Andamento
22. EXTERNO	19% - Em Andamento

Comentários (3)	
Caroline Santos 11/06/2026 07:51	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 11/06/2026 13:40	Início do dia com chuva Breve visita do fiscal Edi e duas auxiliares enquanto estávamos (Caroline, Demétrio e Luciano) verificando as perfurações das estacas. Chegaram algumas tábuas de 10 e 30, porém não chegou tudo! A tarde, sem chuva e céu aberto, ocorreu a chegada do caminhão de concreto com 4m³ Continuidade no levantamento das tubulações...
Caroline Santos 11/06/2026 16:26	Agora só ficam faltando o preenchimento das estacas nas duas perfurações que faltaram!

Fotos (30)

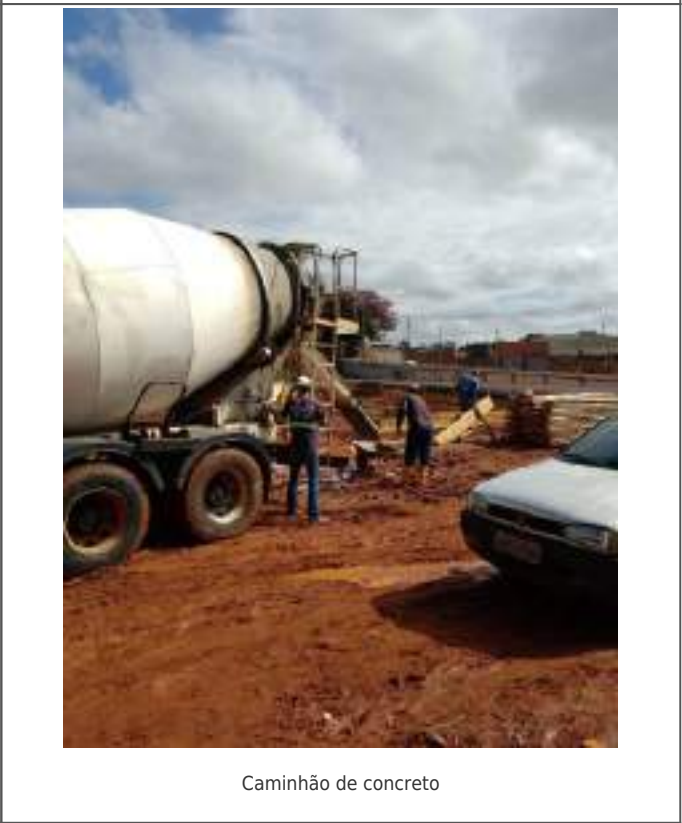	
	 Caminhão de concreto

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Caminhão de concreto



Caminhão de concreto



Caminhão de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Todos os corpo de prova

	
Todos os corpo de prova	Corpo de prova de hoje
	

	
 Canteiro de obras	 Canteiro de obras
 Canteiro de obras	

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Vídeos (3)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:03
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:56
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:05

Carlos Doná

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	25
				Data do relatório	12/06/2026
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	86 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	464 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 16:00	08:00	Manhã	☁ Chuvoso	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (12)						
Pedreiro 3						Mão de Obra Direta (3)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 5	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 1			Terceiros (8)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	35% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	14% - Em Andamento
22. EXTERNO	19% - Em Andamento

Comentários (4)	
Caroline Santos 12/06/2026 07:19	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 12/06/2026 15:23	222 Estacas foram preenchidas de concreto Faltam duas estacas, as que não foram perfuradas São 224 ferragens das estacas 27 sapatas prontas
Caroline Santos 12/06/2026 15:20	Banheiro do container quase finalizado
Caroline Santos 12/06/2026 15:26	Continuidade no levantamento das tubulações...

Fotos (37)

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Canteiro de obras



Canteiro de obras

	
	 Canteiro de obras

	
	
Canteiro de obras	Desenvolvimento das sapatas



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacu.sp.gov.br/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Desenvolvimento das sapatas



Desenvolvimento das sapatas





Banheiro container quase finalizado

Vídeos (4)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:07
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:05
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:03
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:05

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	26
				Data do relatório	15/06/2026
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	461 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☁ Nublado	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (11)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 4	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (8)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	36% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	15% - Em Andamento
22. EXTERNO	20% - Em Andamento

Comentários (9)	
Caroline Santos 15/06/2026 07:14	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 15/06/2026 16:49	Sobre o concreto! 05/06 - 7m³ 06/06 - 8 + 8 = 16m³ 08/06 - 8m³ 09/06 - 8m³ 10/06 - 8 + 7 = 15m³ 11/06 - 4m³ Totalizando 58m³
Caroline Santos 15/06/2026 16:26	Carlos solicitou mais (pedido 131 sienge): 300 TÁBUAS 2x30 300 TÁBUAS 2x10 100 SARRAFO 2x5
Caroline Santos 15/06/2026 16:33	Visita do fiscal Edi Arquiteto na parte da tarde
Caroline Santos 15/06/2026 16:23	Visita da engenheira Veronica que trabalha no SEBRAE, a convite do Luciano. Só conversou sobre experiências profissionais com o Sr. Demétrio
Caroline Santos 15/06/2026 16:52	Alguns pedreiro/carpinteiro/ajudante (3) saíram mais cedo para fazer o exame admissional
Caroline Santos 15/06/2026 16:52	Não chegaram as 25 tábuas que faltavam
Caroline Santos 15/06/2026 17:03	Foram levadas para o canteiro 11 de 1,00x0,60 4 de 0,60x0,60 4 vigas de 3 metros

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

Caroline Santos 15/06/2026 17:06
Continuação dos cálculos das tubulações

Fotos (59)



Chegada das tábuas de 30. (Foram somente 25 que chegaram)



Chegada das tábuas de 30. (Foram somente 25 que chegaram)



Na parte da manha tinham 36 prontas





Desenvolvimento das sapatas



Desenvolvimento das sapatas



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Desenvolvimento das sapatas



	
Desenvolvimento das sapatas	Desenvolvimento das sapatas
	



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

	
 Desenvolvimento das sapatas	 Desenvolvimento das sapatas



Desenvolvimento das sapatas




Desenvolvimento das sapatas



Desenvolvimento das sapatas



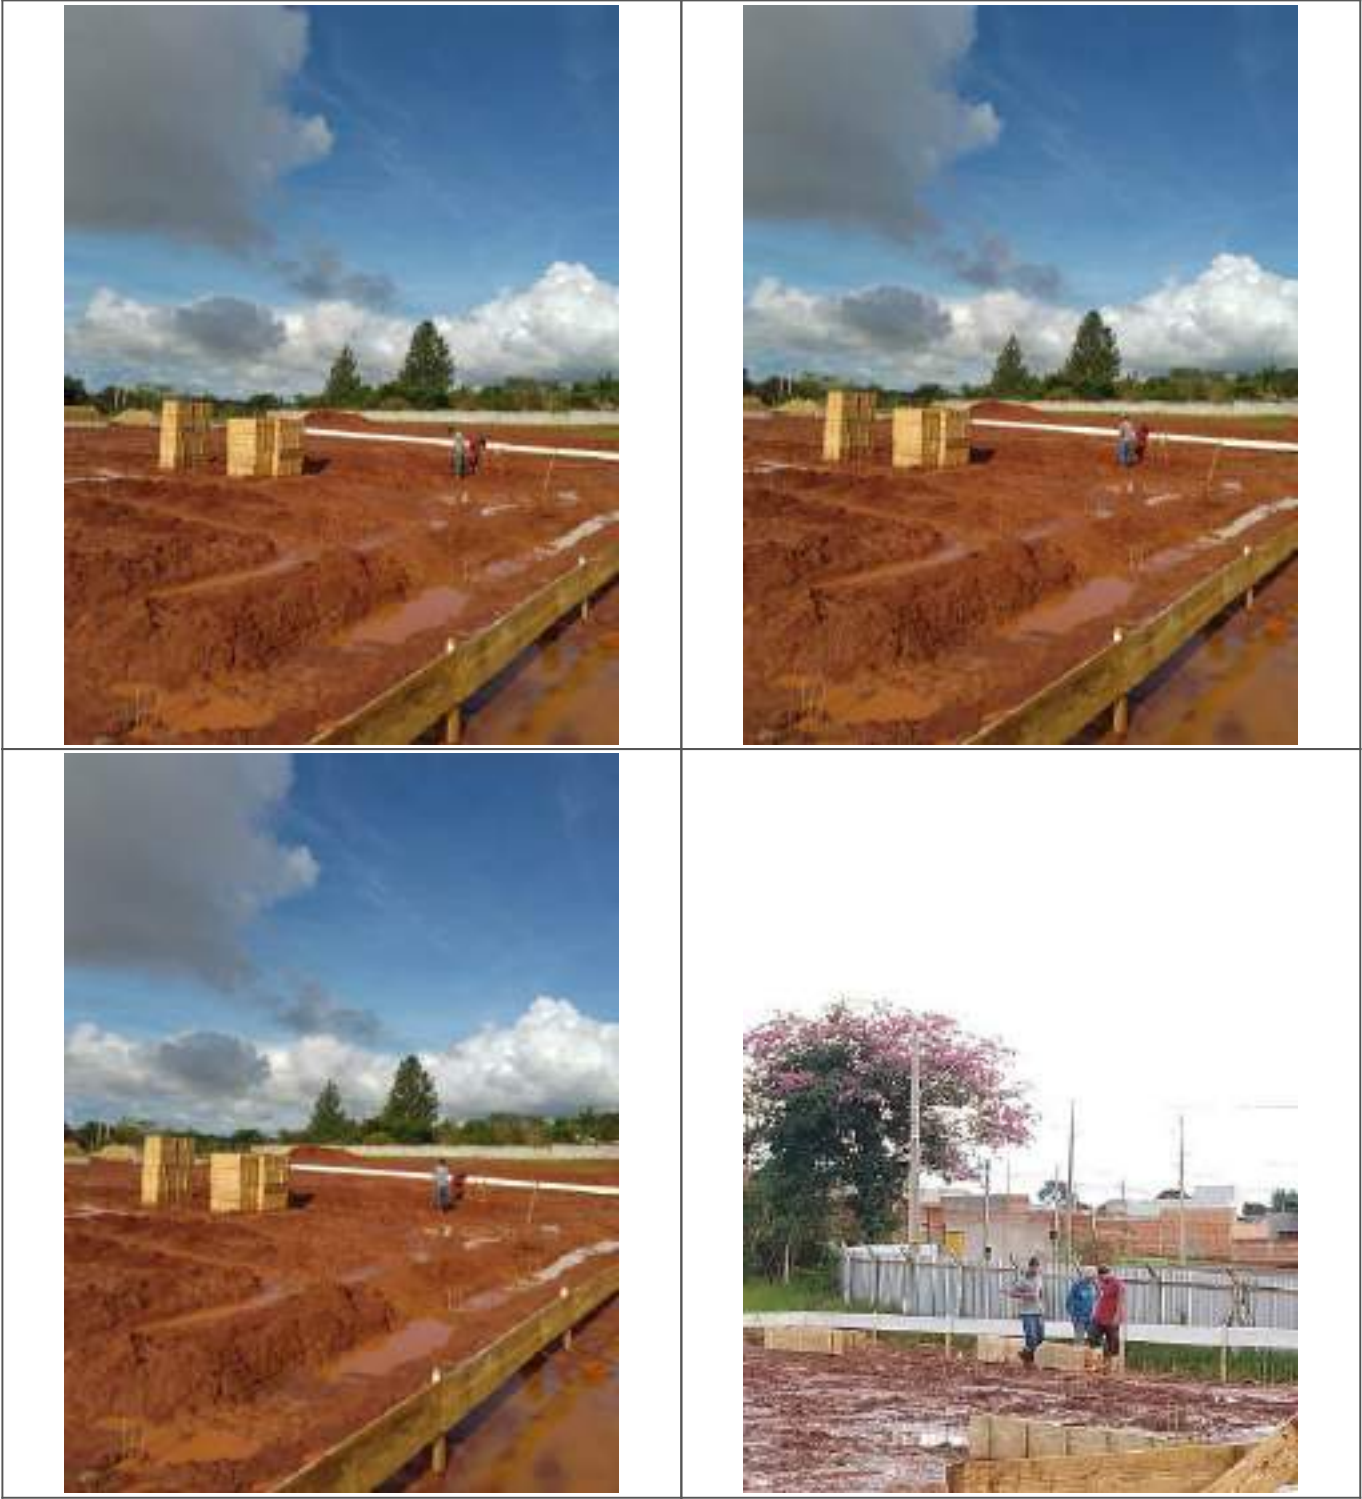

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf





Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Vídeos (5)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:03
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:04
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:08
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:55
Vídeo 5 (visualizar).mp4	00:46

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	27
				Data do relatório	16/06/2026
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	90 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	460 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☁ Nublado	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (15)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1	Engenheiro 1					Mão de Obra Indireta (2)
Ajudante 7	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (11)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	37% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	16% - Em Andamento
22. EXTERNO	21% - Em Andamento

Ocorrências (1)
Informo que o encarregado de obras Luciano, comunicou que o cadeado do portão de entrada encontra-se danificado, possivelmente em decorrência de tentativa de invasão no local. Foi constatado que o cadeado apresenta sinais de violação. Foi anexado uma imagem do cadeado violado para comprovação da ocorrência. Câmeras, serão providenciadas! Invasão de pessoas não autorizadas

Comentários (4)
Caroline Santos 16/06/2026 07:18 LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 16/06/2026 13:12 Hoje, pela manhã chegaram: 150 TÁBUAS 2x30 150 TÁBUAS 2x30 75 TÁBUAS 2x30
Caroline Santos 16/06/2026 16:56 Luciano fez a retirada na Casa Paulista do cadeado para proteção do container!
Caroline Santos 16/06/2026 16:58 Cálculo das tubulações quase finalizado!

Fotos (49)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

	
 Desenvolvimento das sapatas	 Vigas



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

	
	 Tábuas que chegaram



Tábuas que chegaram



Chegaram 150 tábuas de 30 no período da manhã



Cadeado do portão violado











Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf





Vídeos (4)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:04
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:08
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:06
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:13

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	28
				Data do relatório	17/06/2026
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	91 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	459 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (13)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1	Engenheiro 1					Mão de Obra Indireta (2)
Ajudante 5	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (9)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	38% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	17% - Em Andamento
22. EXTERNO	22% - Em Andamento

Comentários (5)	
Caroline Santos 17/06/2026 07:27	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 17/06/2026 09:44	Visita da assessora do prefeito Antian, Simone Albieri. Período da manhã
Caroline Santos 17/06/2026 09:44	Visita dos fiscais Edi e Marco período da manhã
Caroline Santos 18/06/2026 14:33	Hoje, deu-se continuidade nos serviços de fundação. Sendo executadas a montagem e ajustes das formas de madeira para as sapatas/ blocos de fundação. com verificação de nível e prumo. A equipe atuou na organização do canteiro e posicionamento das formas, certificando o espaçamento correto e geometria das fundações! Paralelamente, foi dada a continuidade ao calculo das tubulações, porém houve um certo atraso na finalização porque teve uma instabilidade rápida no computador, dando um pane com desligamento momentâneo. Também foi realizado a verificação e revisão das cotas das vigas baldrame, com o responsável pelas ferragens. As atividades seguem o cronograma!
Caroline Santos 18/06/2026 14:35	Foram realizados os seguintes pedidos para a próxima concretagem (quinta-feira): 126 m³ de Concreto com resistência característica fck = 30 MPa, com programação para atendimento integral no dia. Foi solicitada, também, a disponibilização de bomba lança para execução do lançamento do concreto

Fotos (22)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf





Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

 A photograph showing two people wearing hard hats (one green, one white) and blue work clothes standing on a construction site. The ground is reddish-brown soil, and there are wooden forms visible in the background.	 A photograph showing several construction workers in blue uniforms and hard hats working on a site with wooden forms and reddish-brown soil. A white fence and buildings are visible in the background.
Visita fiscais Edi e Marco	
 A photograph showing construction workers in blue uniforms and hard hats working on a site with wooden forms and reddish-brown soil. The sky is clear blue.	 A photograph showing construction workers in blue uniforms and hard hats working on a site with wooden forms and reddish-brown soil. The sky is clear blue.



Vídeos (9)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:04
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:04
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:04
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:36
Vídeo 5 (visualizar).mp4	00:24
Vídeo 6 (visualizar).mp4	00:13
Vídeo 7 (visualizar).mp4	00:26
Vídeo 8 (visualizar).mp4	00:04
Vídeo 9 (visualizar).mp4	00:07

Carlos Dona

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	29
				Data do relatório	18/06/2026
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	92 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	458 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (13)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 6	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (10)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	39% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	18% - Em Andamento
22. EXTERNO	23% - Em Andamento

Comentários (5)	
Caroline Santos 18/06/2026 07:02	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 18/06/2026 16:46	Foi dada a continuidade aos serviços de execução das sapatas e vigas de fundação, já em andamento, alinhamento das formas no canteiro de obras. As formas estão sendo executadas com utilização de sarrafos de 5cm, tábuas de 2x30 cm e tábuas de 10 cm, de acordo com a necessidade de montagem. É notório o avanço na execução das formas das sapatas e vigas baldrame. Logística e recebimento de materiais: Recebimento de 37 maços de Prego 17x21, os quais foram conferidos e recontados. Já se encontram em utilização pela equipe. As atividades seguem o cronograma! Foi finalizado os cálculos das tubulações.
Caroline Santos 18/06/2026 14:18	Chegaram no período da manhã 150 tábuas de 10cm e 100 sarrafos de 5
Caroline Santos 18/06/2026 14:19	Visita fiscal Edi, no período da tarde
Caroline Santos 18/06/2026 16:53	Foram realizadas 3 compras (Wallace) de impermeabilizante 18L, com 6 unidades em cada pedido, totalizando 18 unidades. A entrega desses materiais está prevista entre os dias 23 e 25, aqui na obra!

Fotos (45)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf





Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf





Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf





Vídeos (9)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:17
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:31
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:04
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:23
Vídeo 5 (visualizar).mp4	00:07
Vídeo 6 (visualizar).mp4	00:23
Vídeo 7 (visualizar).mp4	00:03
Vídeo 8 (visualizar).mp4	00:01
Vídeo 9 (visualizar).mp4	00:05

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	30
				Data do relatório	19/06/2026
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	93 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	457 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 16:00	08:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (13)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 6	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (10)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	40% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	19% - Em Andamento
22. EXTERNO	24% - Em Andamento

Comentários (6)	
Caroline Santos 19/06/2026 07:14	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 19/06/2026 09:10	Visita dos fiscais Edi e Marco pela manhã
Caroline Santos 19/06/2026 10:47	Sobre o Sistema de Câmera e Alarme. O técnico da Guardian Security System veio aqui 10:30, para verificação e levantamento das necessidades. Durante a vistoria, solicitei que o orçamento seja apresentado de forma separada de cada serviço. O técnico informou a possibilidade de utilização de câmeras sem fio. Foram avaliados os pontos estratégicos para instalação de refletores, ele foi registrando cada ponto dos locais indicados para composição do orçamento. Ele também me explicou que o sistema de monitoramento permite acesso remoto via celular, possibilitando as imagens em tempo real e acionamento caso precise. Ele também disse que logo encaminha os orçamentos para avaliação e, caso necessário, poderão ser ajustados conforme a necessidade.
Caroline Santos 19/06/2026 13:47	Hoje, deu-se continuidade nos serviços de fundação. Sendo executadas a montagem e ajustes das formas de madeira para as sapatas/ blocos de fundação. As formas estão sendo executadas com utilização de sarrafos de 5cm, tábuas de 2x30 cm e tábuas de 10 cm, de acordo com a necessidade de montagem. É perceptível o avanço na execução das formas das sapatas e vigas baldrame e ajustes na fundação. As atividades seguem o cronograma!

Caroline Santos19/06/2026 13:45 Monitoramento de pregos 17x21 retirados comigo hoje 3 maços 2 maços 2 maços 4 maços 1 maço 12 maços retirados hoje
Caroline Santos19/06/2026 14:16 Solicitação 145 - 200 sarrafos de 5cm





Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Visita dos fiscais Edi e Marco





Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf





Vídeos (7)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:03
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:02
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:06
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:14
Vídeo 5 (visualizar).mp4	00:02
Vídeo 6 (visualizar).mp4	00:10
Vídeo 7 (visualizar).mp4	00:02

Carlos Dona

Assinatura

Assinatura

 DONA INCORPORAÇÕES LTDA				Relatório n°	31
				Data do relatório	22/06/2026
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	96 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	454 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (14)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 7	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (11)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	41% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	20% - Em Andamento
22. EXTERNO	25% - Em Andamento

Comentários (4)	
Caroline Santos 22/06/2026 07:13	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 22/06/2026 14:26	Visita fiscal Edi e engenheira e apenas disseram que o prefeito quer vir aqui no dia que iniciar a concretagem, para tirar umas fotos.
Caroline Santos 22/06/2026 16:52	Na data de hoje, deu-se continuidade aos serviços de fundação com a concretagem de quatro estacas, isso ocorreu no período da manhã. Foi recebido 1m³ de concreto utilizado para preenchimento das estacas que faltavam. Durante o processo, foi realizado a moldagem do corpo de provas com o concreto recebido hoje, os outros que estavam aqui foram coletados para realização dos ensaios e posterior emissão do laudo de resistência. Também foram mantidos os serviços de montagem e ajustes das formas das vigas baldrame e sapatas. Hoje também, durante o período da manhã vieram alguns representantes políticos, sendo eles o Secretário da Saúde, acompanhado do Representante da deputada federal Juliana Cardoso e três pessoas (não foram apresentados). Solicitaram apenas para visualização a imagem da planta e foi mostrado apenas a planta layout geral. Foram realizados fotos e vídeos pelas autoridades. O responsável pelas ferragens também entregou os arranques, alguns enumerados outros não. Chegaram as armaduras das vigas baldrame e sapatas. Recebidos em obra 200 sarrafos de 5cm, para continuidade das sapatas!
Caroline Santos 23/06/2026 07:45	Ficou agendado para o dia 23/06/2026 2 cargas de blocos (2 milheiros) totalizando 4 mil blocos

Fotos (43)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Andamento da obra



Lacre concreto



Lacre concreto



Lacre concreto



Concreto 1m³




Concreto 1m³



Concreto 1m³

	 Andamento da obra
	

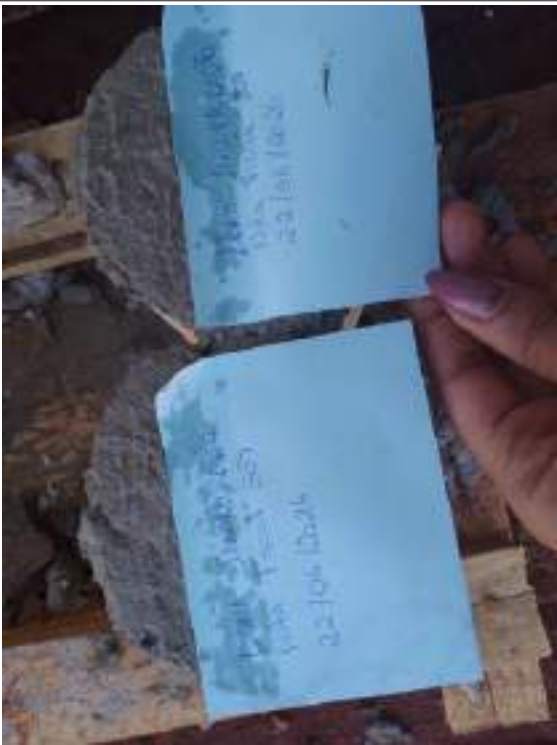	 Andamento da obra
 Corpos de provaNo adesivo colado em cima está escrito "Dona IncorporaçõesNota fiscal 30722/06/26"	 Chegada dos arranque



Chegada dos arranque



representantes políticos, sendo eles o Secretário da Saúde, acompanhado do Representante da deputada federal Juliana Cardoso e três pessoas (não foram apresentados)



representantes políticos, sendo eles o Secretário da Saúde, acompanhado do Representante da deputada federal Juliana Cardoso e três pessoas (não foram apresentados)



Chegada dos arranque



Chegada dos 200 sarafos de 5cm



Chegada das armaduras das vigas



Chegada das armaduras das vigas

	
	 Chegada das armaduras das vigas

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf

	
Chegada das armaduras das sapatas	
	
Chegada das armaduras das sapatas	

Vídeos (8)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:02
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:03
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:13
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:16
Vídeo 5 (visualizar).mp4	00:03
Vídeo 6 (visualizar).mp4	00:26
Vídeo 7 (visualizar).mp4	00:31
Vídeo 8 (visualizar).mp4	00:03



Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	32
				Data do relatório	23/06/2026
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	97 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	453 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☁ Nublado	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de obra (14)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1	Engenheiro 1					Mão de Obra Indireta (2)
Ajudante 6	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (10)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	42% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	21% - Em Andamento
22. EXTERNO	26% - Em Andamento

Comentários (3)	
Caroline Santos 23/06/2026 07:33 LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06	
Caroline Santos 23/06/2026 08:50 Visita arquiteto Edi e arquiteto Marco	
Caroline Santos 23/06/2026 16:50 No dia de hoje, deu-se continuidade nos serviços estruturais om foco na aplicação das ferragens nas sapatas e vigas. Também foram mantidos os serviços de montagem das formas e ajustes das vigas baldrame e sapatas. Hoje também veio o responsável pelas instalações elétricas e hidráulicas, para análise das plantas e compatibilização das passagens de tubulações, que estão previstas para execução após a concretagem. Ocorreu o recebimento e conferência do primeiro lote com 2,000 unidades de blocos cerâmicos (tijolos) entregues na parte da manhã, foi efetuado a contagem em pilhas (47x42+26). Os materiais foram descarregados e estocados para as próximas etapas de alvenaria. No período da tarde, foi recebido o segundo lote e conferido com mais 2,000 unidades, totalizando 4,000 blocos entregues. Também foram recebidos e encaminhados para análise os orçamentos da empresa Guardian, relacionados ao sistema de monitoramento por câmeras e alarmes da edificação.	

Fotos (40)



Desenvolvimento das formas para as vigas



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Chegada dos 2 mil tijolos pela manhã



Chegada dos 2 mil tijolos pela manhã





Chegada dos 2 mil tijolos pela manhã



Chegada dos 2 mil tijolos pela manhã





Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Chegada de mais 2 mil tijolos na parte da tarde



Chegada de mais 2 mil tijolos na parte da tarde



Chegada de mais 2 mil tijolos na parte da tarde





Vídeos (4)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:04
Vídeo 2 (visualizar).mp4 Chegada de mais 2 mil tijolos pela manhã	00:06
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:04
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:16

Carlos Dona

Assinatura

Assinatura

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf

				Relatório nº	33
				Data do relatório	24/06/2026
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	98 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	452 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☔ Chuvoso	Impraticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de obra (13)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 6	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (10)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	42% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	21% - Em Andamento
22. EXTERNO	26% - Em Andamento

Comentários (2)	
Caroline Santos 24/06/2026 07:27 LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06	
Caroline Santos 24/06/2026 15:46 Início do dia com ocorrência de chuva, impossibilitando o começo das atividades até o momento (7:30). Equipe está em espera, aguardando melhora das condições climáticas. Com a redução da chuva, foram iniciados os serviços de montagem dos painéis. Sobre o consumo de pregos, ontem foram utilizados 2 maços de prego para montagem dos painéis. Na data de hoje foram utilizados 5 maços de prego. Foram recebidos 18 unidades de impermeabilizante, foram conferidos e armazenadas no container almoxarifado. Durante a tarde com a estabilização climática, as atividades seguiram normalmente. Visita Arquiteto Edi e arquiteta Carol que trabalha com ele. Segue em anexo os laudos do corpo de prova do concreto de 7 dias	

Fotos (23)



Desenvolvimento dos painéis



Desenvolvimento dos painéis



Descarregamento das 18 unidades de impermeabilizante



Descarregamento das 18 unidades de impermeabilizante



18 unidades de impermeabilizante



Desenvolvimento dos painéis





Desenvolvimento dos painéis

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:05
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:11
Anexos (7)	
LAUDO NOTA 262 - 7DDD.docx	6 MB
LAUDO NOTA 280 - 7DDD.docx	6 MB
LAUDO NOTA 277 - 7DDD.docx	6 MB
LAUDO NOTA 276 - 7DDD.docx	6 MB
LAUDO NOTA 271 - 7DDD.docx	6 MB
LAUDO NOTA 264 - 7DDD.docx	6 MB
Relatório Ensaio de resistência à compressão em corpo de prova.xlsx	13 KB



Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	34
				Data do relatório	25/06/2026
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	99 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	451 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☁ Nublado	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de obra (13)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 6	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (10)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	43% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	89% - Em Andamento
22. EXTERNO	27% - Em Andamento

Comentários (4)	
Caroline Santos 25/06/2026 07:32	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 25/06/2026 08:52	Visita fiscal Edi e engenheira
Caroline Santos 25/06/2026 15:04	Visita fiscal Edi período da tarde
Caroline Santos 25/06/2026 16:54	No dia de hoje, foi dada continuidade aos serviços de montagem dos painéis/caixas e alinhamento das formas das vigas baldrame. Também prosseguiu o posicionamento das ferragens! Foram retirados 12 maços de prego comigo, para a execução dos serviços. Foi atualizado o relatório de ensaios de resistência a compressão do concreto, incluindo na planilha a estimativa da resistência prevista para 28 dias (Mpa). Pelos meus cálculos ficam faltando aproximadamente 9/10 caixas.

Fotos (28)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf





Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Vídeos (4)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:29
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:23
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:13
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:19
Anexos (1)	
Relatório Ensaio de resistência à compressão em corpo de prova.xlsx	14 KB

Carlos Dona

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	35
				Data do relatório	26/06/2026
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	100 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	450 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 16:00	08:00	Manhã	☁ Nublado	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (13)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 6	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (10)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	44% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	89% - Em Andamento
22. EXTERNO	28% - Em Andamento

Comentários (4)	
Caroline Santos 26/06/2026 07:12	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 26/06/2026 15:17	Visita dos fiscais Edi e Marco mais uma arquiteta. Pela manhã! Edi e Marco pediram para avisar o dia que irá iniciar a concretagem para virem fiscalizar um dia antes e no dia da concretagem trazer o prefeito para tirar algumas fotos
Caroline Santos 26/06/2026 16:08	Na presente data, o início das atividades ocorreu sob céu nublado, com ocorrência de chuviscos, sem interrupção dos serviços. Foram recebidas três remessas de armaduras das vigas baldrame, devidamente conferidas e identificadas conforme o projeto estrutural. As peças chegaram enumeradas, facilitando a separação e o posicionamento durante a montagem. Do material recebido, 3 remessas de ferragem de viga baldrame pela manhã. Será destinada à montagem das armaduras horizontais das vigas baldrame, enquanto o restante será utilizado inicialmente na horizontal e o restante nos elementos verticais previstos em projeto. A execução das armaduras seguiu a sequência prevista em projeto, com posicionamento inicial das ferragens das sapatas e, em seguida, a aplicação das armaduras das vigas baldrame resultando na interligação entre os blocos de fundação. Em conjunto com o mestre de obras, foi realizada a conferência e acompanhamento do processo de interligação. 2 remessas de ferragens chegaram na parte da tarde
Caroline Santos 26/06/2026 15:30	Visita fiscal Edi + engenheira Milena. Parte da tarde!

Fotos (43)



Chegada 1ª remessa de aço

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Primeira remessa aço baldrame



Primeira remessa aço baldrame



Analise e conferimento das vigas



Segunda remessa aço baldrame





Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Montagem das armaduras horizontais das vigas baldrame



Montagem das armaduras horizontais das vigas baldrame





Montagem das armaduras horizontais das vigas baldrame



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



1ª remessa da PARTE DA TARDE de ferragens



1ª remessa da PARTE DA TARDE de ferragens



1ª remessa da PARTE DA TARDE de ferragens



Montagem das armaduras horizontais das vigas baldrame



Montagem das armaduras horizontais das vigas baldrame



Montagem das armaduras horizontais das vigas baldrame







2ª remessa da PARTE DA TARDE de ferragens

Vídeos (4)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:07
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:02
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:10
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:16

Carlos Dona

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	36
				Data do relatório	29/06/2026
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	103 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	447 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀️ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (15)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 8	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (12)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	46% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	89% - Em Andamento
22. EXTERNO	30% - Em Andamento

Comentários (3)	
Caroline Santos 29/06/2026 07:18 LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06	
Caroline Santos 29/06/2026 10:14 Dia de jogo do Brasil! Na data de hoje, as atividades foram iniciadas sob condições climáticas favoráveis Em conjunto com Luciano, Demétrio, Rafael (das ferragens) e eu foi realizado a conferência das ferragens dos pilares e o posicionamento correto de cada uma delas! Em paralelo prosseguiu o encaixe das ferragens vigas baldrame junto com as sapatas, interligando uma a outra, conforme o projeto estrutural. Foi realizado o recebimento e a conferência de 2,000 blocos (tijolos).	
Caroline Santos 29/06/2026 10:36 Visita fiscal Edi	

Fotos (23)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf

	 Foto recebida pelo Rafael sábado, remessa das ferragens que foi entregue
 Foto recebida pelo Rafael sábado, remessa das ferragens que foi entregue	 Chegaram 2,000 blocos de tijolos
 Chegaram 2,000 blocos de tijolos	



Chegaram 2,000 blocos de tijolos



Chegaram 2,000 blocos de tijolos





Carlos Dona

Assinatura

Assinatura

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

				Relatório nº	37
				Data do relatório	30/06/2026
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	104 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	446 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (14)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1	Engenheiro 1					Mão de Obra Indireta (2)
Ajudante 6	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (10)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	46% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	98% - Em Andamento
22. EXTERNO	30% - Em Andamento

Comentários (6)	
Caroline Santos 30/06/2026 07:09	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 30/06/2026 10:30	Visita fiscal Edi e Marco na parte da manhã
Caroline Santos 30/06/2026 10:29	Chegaram 200 sarrafos de 5 10 maços de prego 17x21 10 kg de arame recozido
Caroline Santos 30/06/2026 10:29	Chegaram o restante das ferragens
Caroline Santos 30/06/2026 16:58	Na presente data, foi concluída a amarração dos arranques dos pilares às ferragens das sapatas, finalizando a montagem das armaduras para a concretagem. Foram recebidos mais 20 kg de arame recozido. Os 200 sarrafos de 5 cm foram utilizados no travamento das caixarias, sendo solicitado o fornecimento de mais 150 unidades para o andamento do travamento. Foi realizado grande parte da distribuição de brita no interior das caixarias das vigas, preparando para a concretagem Também foi iniciada a elaboração de uma planilha em Excel para controle após a conferência da quantidade de vigas, inclusive os números bateram com o que está na planta.
Caroline Santos 01/07/2026 07:09	Ontem também chegaram 2,000 blocos de tijolos

Fotos (23)



Interligação com as armações



Ferragens das vigas baldrame





Interligação com as armações



Chegada dos 200 sarrafos de 5 para travar as caixas



200 sarrafos de 5 para travar as caixas







Vídeos (3)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:09
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:18
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:02

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	15
				Data do relatório	28/05/2026
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	71 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	479 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30		Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (6)						
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 2	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Pintor 1			Terceiros (5)

Atividades (3)	
Tapume	52% - Em Andamento
LOCAÇÃO DE OBRA	60% - Em Andamento
Canteiro Obras	20% - Em Andamento

Comentários (2)	
Engº Carlos Doná 28/05/2026 10:58	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc. BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m Em execução
Engº Carlos Doná 28/05/2026 11:06	Chegaram - Container Escritório; - Container Almoxarifado.

Fotos (1)



Container Escritório

Carlos Doná

Assinatura

Assinatura

 DONÁ INCORPORAÇÕES LTDA				Relatório nº	16
				Data do relatório	29/05/2026
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	72 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	478 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (6)						
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 2	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Pintor 1			Terceiros (5)

Atividades (4)	
Tapume	67% - Em Andamento
LOCAÇÃO DE OBRA	100% - Concluída
Canteiro Obras	100% - Concluída
Terraplanagem	100% - Concluída

Comentários (1)	
Wallace Doná	01/06/2026 15:12
LOCAÇÕES	
1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06	
1 CONTAINER ESCRITÓRIO - LAULOC - 29/05 A 29/06	

Fotos (15)	
	
Locação da Obra Finalizado	



Containers já em Obra







Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Carlos Dona

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	17
				Data do relatório	01/06/2026
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	75 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	475 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	10:00 - 11:30	01:30	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	-		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (5)						
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 2	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1				Terceiros (4)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	26% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	4% - Em Andamento
22. EXTERNO	12% - Em Andamento

Ocorrências (1)
Fiscais Estiveram na Obra.

Comentários (1)
Engº Carlos Doná 03/06/2026 11:10 Montagem do canteiro de Obras, Barracão apoio, Barracão Refeitório Execução do Gabarito, Remarcamos a Obra.

Fotos (5)

	
Marcação Pontos estaca.	Marcação Pontos estaca.
	
Marcação Pontos estaca.	Barracão Apoio



Barracão Refeitório

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	18
				Data do relatório	02/06/2026
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	76 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	474 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Engenheiro 1	Estagiário 1					Mão de Obra Indireta (2)
Ajudante 3	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1				Terceiros (5)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	26% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	4% - Em Andamento
22. EXTERNO	12% - Em Andamento

Ocorrências (1)
Visita do Prefeito Antonio Takashi e assessora Simone Albieri Estiveram na obra o secretário de obras e os fiscais

Comentários (1)
Caroline Santos 03/06/2026 11:30 Técnico de internet finalizou a instalação

Fotos (3)

	
Andamento do canteiro de obras	Aplicação das estacas
	
Aplicação das estacas	

Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4 Aplicação das estacas	00:09


Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	19
				Data do relatório	03/06/2026
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	77 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	473 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (10)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Engenheiro 1	Estagiário 1					Mão de Obra Indireta (2)
Ajudante 4	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1				Terceiros (6)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	28% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	6% - Em Andamento
22. EXTERNO	14% - Em Andamento

Comentários (1)	
Caroline Santos 04/06/2026 11:22 Início, da cravação de estacas pela manhã (Estaca Franki com fuste apiolado.), com continuidade à tarde, todas sendo executada até a nega com variação de profundidade. Também está sendo executado contrapiso dos Barracões de apoio do canteiro de obras. Visita do Arquiteo fiscal Marco e Edi na parte da manhã Visita do fiscal Edi + auxiliar na parte da tarde	

Fotos (24)



Inicio Estaca Franki com fuste apiolado.



Inicio Estaca Franki com fuste apiolado.



Inicio Estaca Franki com fuste apiolado.



Inicio Estaca Franki com fuste apiolado.



Inicio Estaca Franki com fuste apiolado.



Inicio Estaca Franki com fuste apiolado.



Inicio Estaca Franki com fuste apiolado.



Inicio Estaca Franki com fuste apiolado.



Inicio Estaca Franki com fuste apiolado.



Inicio Estaca Franki com fuste apiolado.



Inicio Estaca Franki com fuste apiolado.



Canteiro de obras



Inicio Estaca Franki com fuste apiolado.



Inicio Estaca Franki com fuste apiolado.



Canteiro de obras



Canteiro de obras



Canteiros de obras



Inicio Estaca Franki com fuste apoiado.



Inicio Estaca Franki com fuste apoiado.



Inicio Estaca Franki com fuste apoiado.



Início Estaca Franki com fuste apoiado.



Início Estaca Franki com fuste apoiado.



Início Estaca Franki com fuste apoiado.



Canteiro de obras

Vídeos (4)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:10
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:37
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:08
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:04

Carlos Dona

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	20
				Data do relatório	05/06/2026
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	79 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	471 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 16:00	08:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (11)						
Pedreiro 3						Mão de Obra Direta (3)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 5	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1				Terceiros (7)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	30% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	8% - Em Andamento
22. EXTERNO	15% - Em Andamento

Ocorrências (1)
Nesta data no período da manhã as 11:45 a empresa recebeu a Notificação Técnica 01/2026 via Whatsapp, que se refere a profundidade das estacas que estão com 6 metros. Cabe salientar que ainda no domingo dia 04/06 o Arquiteto Marcos havia solicitado que não prosseguisse com a concretagem das brocas, pois havia incompatibilização do projeto. Nesta data 05/06 na parte da manhã por volta das 8:00 estive reunido com os arquitetos Marco e Edi e foram amplamente explicados o porquê e os cálculos que embasavam a execução desta forma, uma vez que não havia nenhum projeto, memorial de Cálculo ou ART, que se corrobora que as estacas tinham que ter a profundidade de 10 metros. Entre 8:40 e 9:20, logo após a reunião me foi solicitado e eu enviei todos os materiais a qual descrevi a decisão para a conferencia dos mesmos, e as 11:45 me enviaram a notificação, e as 11:47 em ligação telefônica o fiscal Marco autorizou a continuidade da concretagem Me deram um Prazo de 5 dias para elaborar uma resposta formal e um Laudo que comprovasse o que eu havia explicado (Através de normas e memoriais de cálculo) - Segue a Notificação em Anexo; Alteração de projeto

Comentários (2)
Caroline Santos 05/06/2026 16:00 Hoje chegou 90 arranque de pilar, Tábua 2x30, Tábua pinus 2x10, Sarrafo 2x5, Prego 17x21, Caminhão de concreto com 7metros de concreto Caroline Santos 08/06/2026 12:52 LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06

Fotos (44)

 Andamento Estaca Franki com fuste apiolado.	 Andamento Estaca Franki com fuste apiolado.
 Andamento Estaca Franki com fuste apiolado.	 Andamento Estaca Franki com fuste apiolado.

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Andamento Estaca Franki com fuste apiolado.



Chegada das tabuas



Chegada das tabuas



Chegada das tabuas



Chegada das tabuas



Chegada das tabuas



Arranque de pilar



Arranque de pilar



Arranque de pilar



Arranque de pilar



Arranque de pilar



Arranque de pilar



Arranque de pilar



Arranque de pilar



Arranque de pilar



Canteiro de obras

	
Canteiro de obras	Canteiro de obras
	
Arranque de pilar	Andamento Estaca Franki com fuste apiolado.

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

 Andamento Estaca Franki com fuste apiolado.	 Enchimento das estacas
 Enchimento das estacas	 Enchimento das estacas



Estacas cheias



Estacas cheias



Estacas cheias



Estacas cheias

	
Estacas cheias	Estacas cheias
	
Estacas cheias	Estacas cheias



Enchimento das estacas



Descarregamento de Concreto



Descarregamento de Concreto



Descarregamento de Concreto



Descarregamento de Concreto



Caminhão de concreto



Canteiro de obras



Canteiro de Obras

Vídeos (12)		
Vídeo 1 (visualizar).mp4	Andamento Estaca Franki com fuste apiolado.pela manhã	00:08
Vídeo 2 (visualizar).mp4	Chegada das tábuas	00:07
Vídeo 3 (visualizar).mp4	Descarregamento das tábuas	00:11
Vídeo 4 (visualizar).mp4	Descarregamento de Concreto	00:04
Vídeo 5 (visualizar).mp4	Descarregamento de Concreto	00:18
Vídeo 6 (visualizar).mp4	Descarregamento de Concreto	00:12
Vídeo 7 (visualizar).mp4	Descarregamento de Concreto	00:20
Vídeo 8 (visualizar).mp4	Enchimento das estacas	00:02

Vídeo 9 (visualizar).mp4 Enchimento das estacas	00:14
Vídeo 10 (visualizar).mp4 Enchimento das estacas	00:09
Vídeo 11 (visualizar).mp4 Enchimento das estacas	00:05
Vídeo 12 (visualizar).mp4 Visão geral	00:16
Anexos (1)	
comunicado_UBSassinado (1).pdf	369 KB



Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	21
				Data do relatório	08/06/2026
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	82 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	468 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (14)						
Pedreiro 3						Mão de Obra Direta (3)
Estagiário 1	Engenheiro 1					Mão de Obra Indireta (2)
Ajudante 7	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1				Terceiros (9)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	31% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	10% - Em Andamento
22. EXTERNO	16% - Em Andamento

Ocorrências (1)
Segue em arquivo o calculo estrutural das estacas. Todas passaram na verificação com a profundidade de 6 metros.

Comentários (2)
Caroline Santos 08/06/2026 12:52 LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 08/06/2026 16:53 Chegou o restante das tábuas Entrega das pranchas de hidrossanitário para o Davi Visita dos fiscais Marco e Edi Caminhão de concreto chegou na parte da tarde com 8 metros resultando em 31 estacas

Fotos (23)



Enchimento das estacas



Enchimento das estacas



Estacas preenchidas



Descarregamento de Concreto



Lacre do caminhão de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Lacre do caminhão de concreto



Caminhão de concreto



Andamento Estaca Franki com fuste apoiado.



Andamento Estaca Franki com fuste apiolado.



Andamento Estaca Franki com fuste apiolado.



Restante das tábuas



Canteiro de obras



Descarregamento do concreto



Descarregamento do concreto



Caminhão de concreto



Canteiro de obras



Vídeos (3)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:13
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:06
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:03
Anexos (4)	
Calculo estrutural estacas.pdf	478 KB
SP-03.pdf	619 KB
SP-02.pdf	618 KB
SP-01.pdf	618 KB

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	38
				Data do relatório	01/07/2026
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	105 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	445 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (16)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1	Engenheiro 1					Mão de Obra Indireta (2)
Ajudante 8	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (12)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	46% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	26% - Em Andamento
22. EXTERNO	31% - Em Andamento

Comentários (6)	
Caroline Santos 01/07/2026 07:10	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 01/07/2026 08:17	Chegou o caminhão da bomba de concreto 7:20
Caroline Santos 01/07/2026 07:59	Chegaram 150 Sarrafos de 5
Caroline Santos 01/07/2026 08:01	Visita dos fiscais Edi e Marco
Caroline Santos 01/07/2026 11:00	Fiscal marco passou todo o período da manhã na obra
Caroline Santos 03/07/2026 12:10	Na presente data, foi realizada a concretagem, com utilização dos caminhões betoneira previamente programados e bomba lança para o lançamento do concreto. Durante a concretagem, a obra recebeu a visita do Prefeito, acompanhado de sua assessora, que acompanharam o andamento dos serviços. Engenheiro Carlos e fiscais Edi e Marco Também chegaram Cal e dois baldes de aditivo

Fotos (36)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf









Vídeos (12)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:06
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:03
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:03
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:38
Vídeo 5 (visualizar).mp4	00:24
Vídeo 6 (visualizar).mp4	00:07
Vídeo 7 (visualizar).mp4	00:23
Vídeo 8 (visualizar).mp4	00:28
Vídeo 9 (visualizar).mp4	00:36
Vídeo 10 (visualizar).mp4	00:30
Vídeo 11 (visualizar).mp4	00:34
Vídeo 12 (visualizar).mp4	00:12

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	39
				Data do relatório	02/07/2026
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	106 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	444 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (12)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 5	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (9)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	46% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	27% - Em Andamento
22. EXTERNO	32% - Em Andamento

Comentários (4)	
Caroline Santos 02/07/2026 07:05 LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06	
Caroline Santos 02/07/2026 09:52 Visita fiscal Edi e engenheiro Luis Fernando	
Caroline Santos 02/07/2026 10:28 Chegaram 2 mil blocos de tijolos	
Caroline Santos 03/07/2026 12:07 Foram recebidos e conferidos 2.000 blocos cerâmicos destinados à continuidade da obra. Foi realizado o recebimento e a conferência de materiais hidráulicos e sanitários para as futuras instalações da edificação. Uma parte ficou armazenada no container almoxarifado e a outra no container escritório Teve início a retirada das caixarias (formas) das vigas baldrame após a concretagem, conforme o avanço dos serviços. A obra recebeu a visita da Deputada Juliana Cardoso, acompanhada de seu assessor e do Secretário da Saúde, que acompanharam o andamento dos serviços.	

Fotos (22)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf





Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Vídeos (3)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:02
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:06
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:03



Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	40
				Data do relatório	03/07/2026
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	107 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	443 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 16:00	08:00	Manhã	☁ Nublado	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (14)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 7	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (11)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	47% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	28% - Em Andamento
22. EXTERNO	33% - Em Andamento

Comentários (4)	
Caroline Santos 03/07/2026 07:06	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 03/07/2026 08:28	Visita fiscais Edi e Marco fizeram a medição do refeitório, alojamento
Caroline Santos 03/07/2026 08:46	Chegaram 8m² de areia fina
Caroline Santos 03/07/2026 16:20	Na presente data, tiveram início os serviços de impermeabilização na fundação. Paralelamente, prosseguiu a retirada das caixarias (formas) das vigas baldrame e sapatas, liberando os elementos estruturais após a concretagem. Também está sendo realizada a limpeza e organização do canteiro de obras, com remoção dos resíduos. Foi realizado o recebimento, a conferência e o armazenamento de tubos e materiais hidráulicos e hidrossanitários e lonas, destinados às próximas etapas de execução das instalações da edificação. Realocação dos canos atrás dos containers.

Fotos (21)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



8m² de areia fina



	
	 Impermeabilização
 Impermeabilização	 Impermeabilização

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Impermeabilização



Impermeabilização



Impermeabilização



Realocação dos canos atrás dos containers/alojamento. Serão cobertos com a lona



Realocação dos canos atrás dos containers/alojamento. Serão cobertos com a lona

Vídeos (5)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:08
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:08
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:05
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:02
Vídeo 5 (visualizar).mp4	00:05


Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	41
				Data do relatório	06/07/2026
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	110 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	440 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (15)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1	Engenheiro 1					Mão de Obra Indireta (2)
Ajudante 7	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (11)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	48% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	29% - Em Andamento
22. EXTERNO	34% - Em Andamento

Comentários (5)	
Caroline Santos 06/07/2026 07:07	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 06/07/2026 09:10	Visita fiscal Edi
Caroline Santos 06/07/2026 14:46	Foi solicitado - 70 barras aço CA-50 8mmx12m - 1100 bloco canaleta 19x19x39 - 1056 Laje pre fabricada h12
Caroline Santos 06/07/2026 14:40	Vieram buscar os corpos de prova
Caroline Santos 06/07/2026 16:45	Na data de hoje, as atividades tiveram início com a limpeza e organização do canteiro de obras. Foi dada continuidade aos serviços de impermeabilização. Também foi iniciada a execução da primeira fiada da alvenaria, com o assentamento dos blocos cerâmicos sobre as vigas baldrame impermeabilizadas, marcando o início da elevação das paredes da edificação. Paralelamente, a equipe responsável pelas instalações hidrossanitárias iniciou os serviços de preparação para a execução da infraestrutura hidráulica e sanitária. Também foi executada a ampliação das telhas do alojamento e do refeitório.

Fotos (29)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf





Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf







Vídeos (3)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:04
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:13
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:04



Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	42
				Data do relatório	07/07/2026
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	111 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	439 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (14)						
Pedreiro 2						Mão de Obra Direta (2)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 7	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (11)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	48% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	29% - Em Andamento
22. EXTERNO	34% - Em Andamento

Comentários (5)	
Caroline Santos 07/07/2026 07:09	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 07/07/2026 07:49	Visita fiscal Edi e Marco
Caroline Santos 07/07/2026 09:46	Visita fiscal Edi mais duas pessoas
Caroline Santos 07/07/2026 14:39	Solicitação - 140 sacos de cal - 2 impermeabilizante
Caroline Santos 07/07/2026 16:50	No dia de hoje, foi dada continuidade ao assentamento dos blocos cerâmicos e à escavação para as instalações hidrossanitárias. A obra recebeu o responsável pela execução da laje, Luiz, acompanhado de sua esposa para alinhamento das próximas etapas.

Fotos (22)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf





Vídeos (5)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:06
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:06
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:12
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:09
Vídeo 5 (visualizar).mp4	00:04


Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	43
				Data do relatório	08/07/2026
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	112 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	438 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (16)						
Pedreiro 4						Mão de Obra Direta (4)
Estagiário 1	Engenheiro 1					Mão de Obra Indireta (2)
Ajudante 6	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (10)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	48% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	29% - Em Andamento
22. EXTERNO	34% - Em Andamento

Comentários (4)	
Caroline Santos 08/07/2026 07:10	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 08/07/2026 13:41	Visita fiscal Edi e Marco no período da manhã
Caroline Santos 08/07/2026 13:53	Visita fiscal Edi período da tarde
Caroline Santos 08/07/2026 16:55	No dia de hoje, foi dada continuidade ao assentamento dos blocos cerâmicos. Foi efetuada a impermeabilização das vigas baldrame e demais elementos da fundação. Também foi realizado o recebimento de 2.000 blocos cerâmicos, destinados à continuidade da execução da alvenaria. Foi solicitado mais 8m³ de areia

Fotos (23)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf





Vídeos (3)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:08
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:08
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:07

Carlos Doná

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	44
				Data do relatório	10/07/2026
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	114 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	436 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (14)						
Pedreiro 4						Mão de Obra Direta (4)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 5	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (9)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	49% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	30% - Em Andamento
22. EXTERNO	35% - Em Andamento

Comentários (4)	
Caroline Santos 10/07/2026 07:09	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 10/07/2026 13:30	Chegaram pela manhã Canaleta de concreto 19x19x39 Bloco de concreto 19x19x39 2 mil blocos de tijolos 8m Areia fina
Caroline Santos 10/07/2026 13:31	Período da tarde 154 sacos de cal 2 aditivos
Caroline Santos 10/07/2026 16:23	No dia de hoje, foi dada continuidade ao assentamento dos blocos cerâmicos. Foi realizado o recebimento das canaletas de concreto, que já passaram a ser utilizadas na execução da alvenaria. Também foram recebidos 70 vergalhões.

Fotos (33)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf







Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Vídeos (3)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:12
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:04
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:08

Carlos Doná

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	45
				Data do relatório	13/07/2026
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	117 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	433 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (14)						
Pedreiro 4						Mão de Obra Direta (4)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 5	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (9)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	50% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	31% - Em Andamento
22. EXTERNO	36% - Em Andamento

Comentários (5)	
Caroline Santos 13/07/2026 08:39	Visita fiscal Edi
Caroline Santos 13/07/2026 10:43	Visita fiscal Edi
Caroline Santos 16/07/2026 11:23	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06 Terceiro. 1 Betoneira. 20 Folhas de andaime.
Caroline Santos 13/07/2026 14:01	Visita fiscal Edi e Marco período da tarde
Caroline Santos 13/07/2026 16:59	No dia de hoje, foi dada a continuidade ao assentamento dos blocos e canaletas. Também prosseguiu os serviços hidrossanitários

Fotos (21)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf





Vídeos (4)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:06
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:08
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:04
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:16


Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	46
				Data do relatório	14/07/2026
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	118 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	432 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (14)						
Pedreiro 5						Mão de Obra Direta (5)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 4	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (8)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	51% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	32% - Em Andamento
22. EXTERNO	37% - Em Andamento

Comentários (3)	
Caroline Santos 16/07/2026 11:25	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06 1 Betoneira. 20 Folhas de andaime.
Caroline Santos 14/07/2026 09:11	Visita fiscal Edi
Caroline Santos 14/07/2026 16:56	No dia de hoje, foi dada a continuidade no assentamento de blocos e canaletas. Prosseguiu os serviços de instalação hidrossanitária. Foram solicitados e já recebidos 20 luvas de 50 mm 4 bucha redução 50x40mm Para amanhã ficam solicitados 20 luvas de 50 mm 14 bucha redução 50x40mm

Fotos (22)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf





Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:05
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:15



Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	47
				Data do relatório	15/07/2026
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	119 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	431 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (16)						
Pedreiro 5						Mão de Obra Direta (5)
Estagiário 1	Engenheiro 2					Mão de Obra Indireta (3)
Ajudante 4	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (8)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (3)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	51% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	32% - Em Andamento
22. EXTERNO	37% - Em Andamento

Comentários (6)	
Caroline Santos 16/07/2026 11:25	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06 1 Betoneira. 20 Folhas de andaime.
Caroline Santos 15/07/2026 08:45	Chegaram 2 mil blocos de tijolos 8 furos pela manhã
Caroline Santos 15/07/2026 10:04	Visita fiscal Edi e Marco
Caroline Santos 15/07/2026 15:39	Chegaram mais 2 mil blocos
Caroline Santos 15/07/2026 15:41	Chegaram as ferragens dos pilares, os pilares menores da cobertura, vão voltar para serem arrumados
Caroline Santos 15/07/2026 16:55	No dia de hoje, foi dada a continuidade ao assentamento dos blocos cerâmicos. Foi realizado o recebimento das ferragens dos pilares, que foram conferidas e já distribuídas no local. Ainda sim seguem em processo de reconferência

Fotos (26)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf







Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:15
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:08



Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	48
				Data do relatório	16/07/2026
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	120 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	430 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (14)						
Pedreiro 5						Mão de Obra Direta (5)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 4	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (8)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (5)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	51% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	100% - Em Andamento
22. EXTERNO	37% - Em Andamento
3. ESTRUTURA	60% - Em Andamento
4. ALVENARIA	30% - Em Andamento

Comentários (5)	
Caroline Santos 16/07/2026 07:43	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 16/07/2026 16:09	Chegaram os pilares da cobertura, foi feita a conferência de cada pilar
Caroline Santos 16/07/2026 16:54	Chegaram o pessoal das cameras, iniciaram a passagem dos fios
Caroline Santos 16/07/2026 14:59	Visita fiscal Edi
Caroline Santos 16/07/2026 16:55	No dia de hoje, os serviços se concentraram na amarração dos pilares. Também foi dada continuidade ao assentamento de blocos.

Fotos (10)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:07
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:08

Carlos Doná

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	49
				Data do relatório	17/07/2026
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	121 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	429 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (15)						
Pedreiro 5						Mão de Obra Direta (5)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 5	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (9)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (5)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	51% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	100% - Em Andamento
22. EXTERNO	37% - Em Andamento
3. ESTRUTURA	60% - Em Andamento
4. ALVENARIA	30% - Em Andamento

Comentários (7)	
Caroline Santos 17/07/2026 07:14	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 17/07/2026 08:16	Chegou o caminhão de aterro
Caroline Santos 17/07/2026 08:47	Chegaram o pessoal das cameras
Caroline Santos 17/07/2026 08:48	Início do aterro 8:34
Caroline Santos 17/07/2026 16:11	Chegou a areia fina, período da tarde
Caroline Santos 17/07/2026 16:12	Visita fiscal Edi e Milena
Caroline Santos 22/07/2026 10:35	No dia de hoje, foram iniciados os serviços de aterro, com a operação de dois caminhões. Totalizando um volume de terra de 700 m³ Paralelamente foi dada a continuidade ao assentamento dos blocos e as câmeras foram instaladas!

Fotos (13)





Vídeos (3)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:35
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:39
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:12

Carlos Doná

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	50
				Data do relatório	20/07/2026
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	124 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	426 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (14)						
Pedreiro 5						Mão de Obra Direta (5)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 4	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (8)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (5)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	51% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	100% - Em Andamento
22. EXTERNO	37% - Em Andamento
3. ESTRUTURA	61% - Em Andamento
4. ALVENARIA	33% - Em Andamento

Comentários (4)	
Caroline Santos 20/07/2026 08:21	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 20/07/2026 08:26	Visita Edi, Marco e Luiz Fernando
Caroline Santos 22/07/2026 10:37	Solicitação de materiais comprados a mais do que tem na planilha. - 60 luva esgoto 50mm - 10 redução 75° 50mm - 40 joelho de 45° 50mm - 40 joelho de 45° 40mm - 8 caixa ralo 150/150
Caroline Santos 20/07/2026 16:57	No dia de hoje, foi dada a continuidade no assentamento dos blocos e canaletas, o preparo da argamassa estão sendo realizados com o uso da betoneira.

Fotos (10)





Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:04
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:16

Carlos Doná

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	51
				Data do relatório	21/07/2026
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	125 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	425 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (15)						
Pedreiro 5						Mão de Obra Direta (5)
Estagiário 1	Engenheiro 1					Mão de Obra Indireta (2)
Ajudante 4	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (8)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (5)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	51% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	100% - Em Andamento
22. EXTERNO	37% - Em Andamento
3. ESTRUTURA	61% - Em Andamento
4. ALVENARIA	33% - Em Andamento

Comentários (3)	
Caroline Santos 21/07/2026 07:14 LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06	
Caroline Santos 21/07/2026 09:42 Visita fiscal Edi	
Caroline Santos 21/07/2026 16:52 Continuidade no assentamento de blocos canaletas, e o preparo da argamassa estão sendo realizados com o uso da betoneira. Também ocorreu um pouco do serviços de aterro, com espalhamento da terra.	

Fotos (10)	
	



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:07
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:09



Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	52
				Data do relatório	22/07/2026
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	126 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	424 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (13)						
Pedreiro 4						Mão de Obra Direta (4)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 4	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (8)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (5)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	51% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	100% - Em Andamento
22. EXTERNO	37% - Em Andamento
3. ESTRUTURA	61% - Em Andamento
4. ALVENARIA	33% - Em Andamento

Comentários (3)	
Caroline Santos 22/07/2026 07:46 LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06	
Caroline Santos 22/07/2026 08:52 Visita fiscais Edi e Marco	
Caroline Santos 22/07/2026 16:44 Continuidade no assentamento de blocos canaletas, e o preparo da argamassa estão sendo realizados com o uso da betoneira. Também um pouco do serviços de aterro, com espalhamento da terra. Clima nublado, ameaçando chuva no período da tarde. As instalações hidráulicas com execução e adequação das tubulações nos pontos previstos	

Fotos (10)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:03
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:06

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2026/25671/25671_original.pdf

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	53
				Data do relatório	23/07/2026
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	127 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	423 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☁ Nublado	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (14)						
Pedreiro 4						Mão de Obra Direta (4)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 5	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (9)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (5)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	51% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	100% - Em Andamento
22. EXTERNO	37% - Em Andamento
3. ESTRUTURA	61% - Em Andamento
4. ALVENARIA	33% - Em Andamento

Comentários (4)	
Caroline Santos 23/07/2026 07:17	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 23/07/2026 08:58	Visita fiscal Edi
Caroline Santos 23/07/2026 17:31	As 9:20 a bobcat deu início ao aterro As 13:53 Pausou para o almoço As 14:53 Voltou 17:30
Caroline Santos 23/07/2026 16:50	Na data de hoje , foi utilizada a bobcat para execução dos serviços de aterro, fazendo o espalhamento da terra. Paralelamente foi dada a continuidade nas instalações hidráulicas com execução e adequação das tubulações nos pontos previstos

Fotos (10)



Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:21
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:06

				Relatório nº	54
				Data do relatório	24/07/2026
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	128 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	422 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 16:00	08:00	Manhã	☔ Chuvoso	Impraticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☔ Chuvoso	Impraticável

Mão de obra (14)						
Pedreiro 4						Mão de Obra Direta (4)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 5	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (9)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (5)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	51% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	100% - Em Andamento
22. EXTERNO	37% - Em Andamento
3. ESTRUTURA	61% - Em Andamento
4. ALVENARIA	33% - Em Andamento

Comentários (3)	
Caroline Santos 24/07/2026 07:55 LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06	
Caroline Santos 24/07/2026 07:56 Pela manhã foi descarregado 120 sacos de cimento	
Caroline Santos 24/07/2026 10:23 Também foram descarregados 77 telas para contrapiso	

Fotos (3)



Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:03
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:06

				Relatório nº	55
				Data do relatório	27/07/2026
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	131 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	419 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (10)						
Pedreiro 3						Mão de Obra Direta (3)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 2	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (6)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (5)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	52% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	100% - Em Andamento
22. EXTERNO	38% - Em Andamento
3. ESTRUTURA	63% - Em Andamento
4. ALVENARIA	35% - Em Andamento

Comentários (5)	
Caroline Santos 27/07/2026 07:24	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/0
Caroline Santos 27/07/2026 10:55	Visita fiscal Edi
Caroline Santos 27/07/2026 17:01	Bob cat não terminou os serviços porque foi inviável continuar em decorrência da terra úmida
Caroline Santos 27/07/2026 14:47	Foram descarregadas EPS Lajes isopor: 87 pacotes de 8 Mais 4 peças separadas 700 peças
Caroline Santos 27/07/2026 16:56	No dia de hoje, clima favorável. Foi dada a continuidade ao assentamento de blocos e nos serviços de hidraulica

Fotos (8)





Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:04
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:23

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	56
				Data do relatório	28/07/2026
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	132 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	418 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (12)						
Pedreiro 3						Mão de Obra Direta (3)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 4	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (8)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (5)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	52% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	100% - Em Andamento
22. EXTERNO	38% - Em Andamento
3. ESTRUTURA	63% - Em Andamento
4. ALVENARIA	35% - Em Andamento

Comentários (3)	
Caroline Santos 28/07/2026 07:15	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 28/07/2026 16:15	Visita Edi e Marco período da tarde
Caroline Santos 28/07/2026 16:23	Continuidade no assentamento de blocos e nos serviços de hidráulica

Fotos (10)	
	





Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:04
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:16

				Relatório nº	57
				Data do relatório	29/07/2026
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	133 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	417 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (13)						
Pedreiro 3						Mão de Obra Direta (3)
Estagiário 1	Engenheiro 1					Mão de Obra Indireta (2)
Ajudante 4	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (8)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (5)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	52% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	100% - Em Andamento
22. EXTERNO	38% - Em Andamento
3. ESTRUTURA	63% - Em Andamento
4. ALVENARIA	35% - Em Andamento

Comentários (4)	
Caroline Santos 29/07/2026 07:15	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 29/07/2026 14:54	Visita fiscal Edi e engenheira Milena
Caroline Santos 29/07/2026 16:59	No dia de hoje, foi dada a continuidade no assentamento de blocos e os serviços de instalações hidráulicas. Hoje também aconteceu à concretagem de 11 pilares, vieram 2,5m³ de concreto.
Caroline Santos 29/07/2026 16:48	Chegaram os 15kg de arame recozido

Fotos (10)





Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:27
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:16

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	58
				Data do relatório	30/07/2026
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	134 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	416 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☁ Chuvoso	Impraticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☁ Chuvoso	Impraticável

Mão de obra (12)						
Pedreiro 3						Mão de Obra Direta (3)
Estagiário 1						Mão de Obra Indireta (1)
Ajudante 4	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (8)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (5)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	52% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	100% - Em Andamento
22. EXTERNO	38% - Em Andamento
3. ESTRUTURA	63% - Em Andamento
4. ALVENARIA	35% - Em Andamento

Comentários (3)	
Caroline Santos 30/07/2026 07:30	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 30/07/2026 07:31	Em decorrência das chuvas os serviços de hoje não foram continuados, local está impraticável
Caroline Santos 31/07/2026 07:13	Parecer, chegou o caminhão com mais eps. Eu e seu Demétrio viemos aqui. Mas o descarregamento ficou para amanhã cedo para o pessoal descarregar. E o caminhão não daria para entrar hoje 30/07! Mas ficou certo para o dia seguinte.

Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	59
				Data do relatório	31/07/2026
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	UBS PORTE 5 - PARAGUAÇU PAULISTA			Prazo contratual	550 dias
Local	Rua França, 412 Bairro Ville de France			Prazo decorrido	135 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista	Responsável	Eng. Carlos doná e Engª Adrielly Freitas	Prazo a vencer	415 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 16:00	08:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 12:30		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (15)						
Pedreiro 4						Mão de Obra Direta (4)
Estagiário 1	Engenheiro 1					Mão de Obra Indireta (2)
Ajudante 5	Encarregado de Obras 1	Mestre de Obras 1	Carpinteiro 2			Terceiros (9)

Equipamentos (2)					
Container 2					

Atividades (5)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	52% - Em Andamento
2. FUNDAÇÃO	100% - Em Andamento
22. EXTERNO	38% - Em Andamento
3. ESTRUTURA	63% - Em Andamento
4. ALVENARIA	37% - Em Andamento

Comentários (4)	
Caroline Santos 31/07/2026 07:14	LOCAÇÕES 1 CONTAINER ALMOXARIFADO - LAULOC - 29/05 A 29/06 1 CONTAINER ESCRITÓRIO- LAULOC - 29/05 A 29/06
Caroline Santos 31/07/2026 10:14	Visita fiscal Edi e Marco, verificaram a hidraulica
Caroline Santos 31/07/2026 13:07	Foi descarregado pela manha 287 pacotes de 8 mais 4 soltas. Totalizando 2300 eps lajes
Caroline Santos 31/07/2026 16:56	Continuidade no assentamento de blocos e serviços relacionados as instalações hidráulicas.

Fotos (10)





Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:10
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:15

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

Nome do Órgão: Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Nome do Projeto: Implantação de Ciclovia e Paisagismo - Avenida Hissagy

Marubayashi

Período de Execução: 01/12/2025 a 31/12/2025

% Executado no Período: 0%

1) Descrever a finalidade do convênio e seus objetivos;

Implantar ciclovia com paisagismo em trecho urbano, promovendo mobilidade ativa, segurança viária e qualidade ambiental no entorno da Avenida Hissagy Marubayashi. O projeto integra o plano de requalificação viária do município.

2) As atividades desenvolvidas com recursos da contrapartida e as categorias de gastos;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO			
Recursos Próprios – Contrapartida	Cat. Gasto	Previsto R\$	Executado R\$
Assessoria	R\$70.687,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$70.687,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3) As atividades desenvolvidas com recursos do FID e as categorias de gastos;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO			
Recursos FID	Cat. Gasto	Previsto R\$	Executado R\$
PLACA DA IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	R\$ 4.983,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	R\$ 11.707,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80M ²	R\$ 7.092,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	R\$ 9.091,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE P ISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021			
POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00M	R\$ 79.970,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	R\$ 5.094,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA SOLAR 120W ALL-IN-ONE REAL PARA POSTE COM 3.6000 LÚMENS	R\$ 70.209,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED SOLAR	R\$ 5.884,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 989.851,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00

4) Comparativo entre as metas propostas no plano de trabalho e os resultados alcançados;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO		
	Meta	Executado
Execução de Obras	0%	0%
Aquisição de Equipamentos	0%	0%

Descrever os resultados já alcançados e incluir o relatório fotográfico (fotos coloridas) do desenvolvimento da obra.

A empresa contratada foi formalmente cobrada no dia 05 de dezembro, por meio de e-mail, conforme *print* anexado. Em resposta, a empresa informou que iniciaria os serviços no dia 05 de janeiro, em razão da paralisação de fim de ano, conforme manifestação também anexada.

Não há fotos do desenvolvimento da obra, pois a mesma não foi iniciada.

Re: Ordem de Serviço referente ao início da obra de Construção da Ciclovia da Avenida Hissagy Marubayashi

Para Neromê Concrete S/A em 05/12/2025 13:30
Detalhes Cabeçalhos Texto simples

WhatsApp Image 2025-12-05 at 13:02:46 (1).pdf (-254 KB)

Bom tarde,

Estamos aguardando contato da vocês para darmos início a obra. Informamos que já se passou quase um mês desde a assinatura da ordem de início, realizada no dia 13 de mês passada, e até o momento não houve qualquer mobilização no local, apesar de a execução estar devidamente liberada.

Nos anexos, seguem as notas de empacote.

Aguardamos o retorno e o início dos serviços.
Obrigado.

Print do e-mail enviado para empresa cobrando o início da obra.



Responsável pela elaboração: Marco Antonio Martins – Secretário adjunto – CAU/SP A189485-4



**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGUAÇU
PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO.**

Ref.: Prorrogação do Início da Execução

Concorrência Pública nº 07/2025

NOROMIX CONCRETO S.A., já qualificada no contrato firmado, oriundo da licitação em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossas Senhorias, informar a **DATA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS**, consubstanciado nas razões de fato e de direito a seguir expostas:

A Contratada firmou com esta Administração, contrato visando a execução de obra de engenharia – construção de ciclovia.

O prazo do contrato é de 12 meses da ordem de serviço, que foi emitida em 13/11/2025 (embora na OS tenha constado 18 meses).

Fato é que o cronograma é de 12 meses e a empresa o fará, ou seja, finalizará a obra até 13/11/2026, impreterivelmente.

Contudo, ante a necessidade de preparo do terreno e a impossibilidade de execução neste período chuvoso, informa ao ente, que iniciará no início do próximo ano, assim que o tempo estiar.

Iniciar neste momento, tornará a obra improdutiva e passível de retrabalho, podendo onerar a empresa ou os cofres públicos, bem como comprometer a qualidade final da obra.

NOROMIX CONCRETO S/A | CNPJ 10.558.895/0001-38 – I.E. 130.998.748.119

E-mail: noromixconcreto@gmail.com – Fone (17) 3426-7500

Matriz - Rua Joaquim Floriano, nº 888, Conj. 605, Itaim Bibi, CEP 04.534-003, São Paulo(SP)

A empresa aproveita o tempo chuvoso e concede férias coletivas aos seus funcionários para que possam passar este tempo de festividades junto aos seus familiares, prezando o convívio familiar, sempre prezando atendimento à legislação trabalhista junto ao planejamento anual da empresa.

Vale ressaltar que não se trata de pedido de prorrogação de prazo da obra. A obra continuará a ser entregue no prazo do contrato. Porém, o início é que se estenderá um pouco mais, de modo que comunica este ente e requer autorização para tanto, sem qualquer prejuízo.

A prorrogação do início para um período de estabilidade climática atende ao **Princípio da Eficiência** e da **Economicidade**, pois evita paralisações forçadas por chuva e garante que a execução ocorra de forma contínua e célere uma vez iniciada.

Diante do exposto, a fim de garantir a boa técnica de engenharia e a segurança da execução contratual, solicita-se a Vossas Senhorias, seja aprovado o início da obra para o início do ano de (em janeiro de 2026).

Nestes termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 10 de dezembro de 2025.

MARCELO
TAVARES DE
SOUZA:21914
903870

Assinado digitalmente por MARCELO
TAVARES DE SOUZA:21914903870
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=19842184000165, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=MARCELO TAVARES DE
SOUZA:21914903870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.10 16:11:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

NOROMIX CONCRETO S.A.
MARCELO TAVARES

NOROMIX CONCRETO S/A | CNPJ 10.558.895/0001-38 – I.E. 130.998.748.119

E-mail: noromixconcreto@gmail.com – Fone (17) 3426-7500

Matriz - Rua Joaquim Floriano, nº 888, Conj. 605, Itaim Bibi, CEP 04.534-003, São Paulo(SP)

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

Nome do Órgão: Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Nome do Projeto: Implantação de Ciclovia e Paisagismo - Avenida Hissagy

Marubayashi

Período de Execução: 01/01/2026 a 31/01/2026

% Executado no Período: 0%

1) Descrever a finalidade do convênio e seus objetivos;

Implantar ciclovia com paisagismo em trecho urbano, promovendo mobilidade ativa, segurança viária e qualidade ambiental no entorno da Avenida Hissagy Marubayashi. O projeto integra o plano de requalificação viária do município.

2) As atividades desenvolvidas com recursos da contrapartida e as categorias de gastos;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO			
Recursos Próprios – Contrapartida	Cat. Gasto	Previsto R\$	Executado R\$
Assessoria	R\$70.687,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$70.687,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3) As atividades desenvolvidas com recursos do FID e as categorias de gastos;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO			
Recursos FID	Cat. Gasto	Previsto R\$	Executado R\$
PLACA DA IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	R\$ 4.983,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	R\$ 11.707,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80M ²	R\$ 7.092,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	R\$ 9.091,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	R\$ 4.572,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	R\$ 1.438,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 42.291,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021	R\$ 85.771,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25MPA	R\$ 95.105,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	R\$ 63.551,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	R\$ 31.515,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE DE BRITA GRADUADA	R\$ 65.144,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	R\$ 323.615,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA ACRÍLICA PARA FAIXAS DEMARCATORIAS	R\$ 21.506,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO PATA DE VACA - H=2,00M	R\$ 8.627,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	R\$ 113,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	R\$ 37.610,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS	R\$ 2.300,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE	R\$ 12.654,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE P ISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021			
POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00M	R\$ 79.970,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	R\$ 5.094,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA SOLAR 120W ALL-IN-ONE REAL PARA POSTE COM 3.6000 LÚMENS	R\$ 70.209,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED SOLAR	R\$ 5.884,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 989.851,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00

4) Comparativo entre as metas propostas no plano de trabalho e os resultados alcançados;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO		
	Meta	Executado
Execução de Obras	0%	0%
Aquisição de Equipamentos	0%	0%

Descrever os resultados já alcançados e incluir o relatório fotográfico (fotos coloridas) do desenvolvimento da obra.

A empresa instalou a placa da obra em 30/01/2026 , após ter sido notificada , conforme notificação e resposta da empresa anexadas abaixo.

Segue, ainda, o registro fotográfico da placa da obra .



Documento assinado digitalmente
gov.br MARCO ANTONIO MARTINS
Data: 03/03/2026 17:18:33-0300
Verifique em <https://validar.ufgov.br>

Responsável pela elaboração: Marco Antonio Martins – Secretário adjunto – CAU/SP A189485-4



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 19 de Janeiro de 2026.

À

Marcelo Tavares de Souza

CNPJ: 10.558.895/0001-38

Rua Joaquim Floriano, nº 888, Conj. 605, Itaim Bibi em São Paulo – SP

Ref.: Contrato nº N° 042/2025

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025.

Objeto: Construção de ciclovia na Avenida Hissagy Marubayashi.

1ª NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, por meio do Arquiteto Fiscal, vem por meio desta **NOTIFICAR** a empresa **NOROMIX CONCRETO S/A** pelo não cumprimento do cronograma da obra em referência.

A empresa assinou a ordem de início em 13 de novembro de 2025. A partir desta data, a contratada estava liberada para iniciar as obras. No dia 05/12/2025, enviamos um e-mail cobrando o começo das atividades. A empresa respondeu na mesma data, solicitando o adiamento do início para 05/01/2026, justificando a decisão devido às festas de fim de ano e ao período de chuvas.

Contudo, mesmo após a data solicitada, a empresa não compareceu ao canteiro de obras. No dia 05/01/2026, entramos em contato via WhatsApp com o engenheiro da empresa, Sr. Adolpho Nunes, que não informou uma data oficial de início. No dia seguinte (06/01/2026), enviamos um novo e-mail de cobrança, que permanece sem resposta até o momento.

Devido ao atraso superior a dois meses, a empresa está sendo notificada e tem o prazo de 3 dias para iniciar os serviços. O não cumprimento desta notificação sujeitará a contratada a uma segunda sanção administrativa.



F.S. PROJETOS AMBIENTAIS LTDA EPP

Rua Lima e Costa, nº 209, Bairro Boa Vista, Marília/SP-
CEP: 17.501-500 – Fone: (14) 99147-4648

PARECER PROCESSO LICITATÓRIO

F.S Projetos Ambientais LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ.nº 34.094.119/0001-92, com sede a Rua Lima e Costa nº 209, bairro Boa Vista, Marília-SP, empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, para auditoria independente, atendendo os itens 14.5 e 14.6 do edital nº 01 SJC/FID/2021 para auxiliar a prefeitura no processo licitatório, acompanhamento da obra, nas medições dos serviços executados e no recebimento final da Ciclovía da Avenida Hissgy Marubayashi, vem pelo presente expor que:

Serviços executados;

1ª Notificação a empresa NOROMIX CONCRETO S/A

De pronto cabe destacar a data da Ordem de Serviços do dia 13/11/2025 autorizando o início dos serviços.

Ao analisar a 1ª Notificação apresentada pelo município cobrando o início imediato dos serviços da construção da Ciclovía da Avenida Hissgy Marubayashi no município de Paraguaçu Paulista/SP,

OPINAMOS pela procedências e continuidade da 1ª notificação.

Marília, 19 de janeiro de 2026

.....
F.S. PROJETOS AMBIENTAIS LTDA EPP
Edson Geraldo Sabbag Junior
Eng. Civil CREA/SP n.º 5061405394



ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP.

Ref.: RESPOSTA À 1ª NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. Contrato
Administrativo nº 042/2025

NOROMIX CONCRETO S/A, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do Processo Administrativo em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, em atenção à Notificação datada de 19 de janeiro de 2026, apresentar sua **DEFESA PRÉVIA E PLANO DE AÇÃO**, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

Inicialmente, a Contratada ratifica seu integral compromisso com a execução do objeto pactuado — a construção de ciclovias na Avenida Hissagy Marubayashi.

Recebemos a notificação que aponta atraso no cronograma e concede prazo para início dos serviços. Em respeito ao princípio da boa-fé objetiva que rege as contratações públicas (art. 5º da Lei nº 14.133/2021), servimo-nos da presente para alinhar, de forma definitiva e irretratável, o início das operações.

Não há, sob nenhuma hipótese, intenção de inexecução ou abandono. O lapso temporal recente deveu-se exclusivamente a ajustes logísticos complexos e à necessidade de garantir que, uma vez iniciada a obra, esta não sofra interrupções por falta de maquinário ou insumos, garantindo a eficiência exigida pelo contrato.



Em resposta direta à solicitação da Administração para o início dos serviços, a Noromix apresenta o seguinte planejamento executivo, que já se encontra em fase de disparada operacional:

- **FASE 1: MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO (Início Imediato):** Na próxima semana (compreendida entre **26/01/2026 e 30/01/2026**), a Contratada realizará a **mobilização pesada de equipamentos**, montagem de logística de apoio e alocação das equipes preliminares no local da obra. *Juridicamente, requer-se que esta etapa seja considerada como o marco de atendimento à notificação, visto que a mobilização é parte integrante e indispensável da execução do objeto.*

- **FASE 2: INÍCIO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA (Data Definitiva):** As atividades construtivas propriamente ditas (movimentação de terra, demarcações e infraestrutura da ciclovía) iniciarão, impreterivelmente, no dia **02 de fevereiro de 2026 (segunda-feira)**.

A Cláusula Décima Segunda do Contrato prevê sanções para casos de inexecução ou atraso injustificado. Contudo, a aplicação de penalidades deve observar os princípios da **razoabilidade e da proporcionalidade**.

Considerando que:

1. A empresa está se apresentando voluntariamente com uma data firme e próxima para o início (apenas alguns dias de diferença da data da notificação);
2. A mobilização de equipamentos já na próxima semana demonstra a cessação da inércia;
3. O contrato possui vigência de 12 meses, sendo perfeitamente viável a recuperação do cronograma físico-financeiro sem prejuízo à entrega final do objeto;



Entendemos que a aplicação imediata de sanções, como advertência ou multa, seria medida excessivamente gravosa e não atenderia ao interesse público primário, que é a entrega da obra. A sanção administrativa tem caráter pedagógico e punitivo, tornando-se inócua quando a Contratada demonstra, proativamente, a correção da conduta.

Diante do exposto, certos da compreensão e da parceria que deve permear a relação entre o Poder Público e o particular, requeremos:

a) O **recebimento** desta manifestação como prova de boa-fé e compromisso contratual; b) O **acatamento do cronograma** supraexposto, considerando-se sanada a pendência apontada na Notificação com o início da mobilização na semana de 26/01/2026 e início dos trabalhos civis em 02/02/2026; c) A **suspensão** de qualquer procedimento sancionatório ou aplicação de penalidade, condicionada ao cumprimento das datas aqui estipuladas.

Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos nosso compromisso em entregar uma obra de excelência para a população de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,

São Paulo/SP, 23 de janeiro de 2026.

**MARCELO
TAVARES DE
SOUZA:21914
903870
NOROMIX CONCRETO S/A**

Assinado digitalmente por MARCELO
TAVARES DE SOUZA:21914903870
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
19842184000165, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO
TAVARES DE SOUZA:21914903870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.23 16:18:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Marcelo Tavares

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

Nome do Órgão: Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Nome do Projeto: Implantação de Ciclovia e Paisagismo - Avenida Hissagy

Marubayashi

Período de Execução: 01/02/2026 a 28/02/2026

% Executado no Período: 0%

1) Descrever a finalidade do convênio e seus objetivos;

Implantar ciclovia com paisagismo em trecho urbano, promovendo mobilidade ativa, segurança viária e qualidade ambiental no entorno da Avenida Hissagy Marubayashi. O projeto integra o plano de requalificação viária do município.

2) As atividades desenvolvidas com recursos da contrapartida e as categorias de gastos;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO			
Recursos Próprios – Contrapartida	Cat. Gasto	Previsto R\$	Executado R\$
Assessoria	R\$70.687,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$70.687,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3) As atividades desenvolvidas com recursos do FID e as categorias de gastos;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO			
Recursos FID	Cat. Gasto	Previsto R\$	Executado R\$
PLACA DA IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	R\$ 4.983,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	R\$ 11.707,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80M²	R\$ 7.092,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	R\$ 9.091,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	R\$ 4.572,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018			
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	R\$ 1.438,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 42.291,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021	R\$ 85.771,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25MPA	R\$ 95.105,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	R\$ 63.551,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	R\$ 31.515,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE DE BRITA GRADUADA	R\$ 65.144,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	R\$ 323.615,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA ACRÍLICA PARA FAIXAS DEMARCATORIAS	R\$ 21.506,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO PATA DE VACA - H=2,00M	R\$ 8.627,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	R\$ 113,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	R\$ 37.610,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS	R\$ 2.300,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE	R\$ 12.654,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE P ISO DE CONCRETO EXISTENTE.			

AF_11/2021			
POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00M	R\$ 79.970,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	R\$ 5.094,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA SOLAR 120W ALL-IN-ONE REAL PARA POSTE COM 3.6000 LÚMENS	R\$ 70.209,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED SOLAR	R\$ 5.884,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 989.851,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00

4) Comparativo entre as metas propostas no plano de trabalho e os resultados alcançados;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO		
	Meta	Executado
Execução de Obras	0%	0%
Aquisição de Equipamentos	0%	0%

Descrever os resultados já alcançados e incluir o relatório fotográfico (fotos coloridas) do desenvolvimento da obra.

No dia 11/02/2026, a empresa deu início à obra, realizando serviços de terraplanagem. Não foi preenchido o quadro de valores com percentual concluído, uma vez que não foram realizadas medições até o momento. Dessa forma, não houve pagamento à empresa até a presente data.





**Responsável pela elaboração: Marco Antonio Martins – Secretário adjunto – CAU/SP
A189485-4**

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

Nome do Órgão: Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Nome do Projeto: Implantação de Ciclovia e Paisagismo - Avenida Hissagy

Marubayashi

Período de Execução: 01/03/2026 a 31/03/2026

% Executado no Período: 2,07%

1) Descrever a finalidade do convênio e seus objetivos;

Implantar ciclovia com paisagismo em trecho urbano, promovendo mobilidade ativa, segurança viária e qualidade ambiental no entorno da Avenida Hissagy Marubayashi. O projeto integra o plano de requalificação viária do município.

2) As atividades desenvolvidas com recursos da contrapartida e as categorias de gastos;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO			
Recursos Próprios – Contrapartida	Cat. Gasto	Previsto R\$	Executado R\$
Assessoria	R\$70.687,49	R\$35.343,74	R\$ 35.343,74
	R\$70.687,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3) As atividades desenvolvidas com recursos do FID e as categorias de gastos;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO			
Recursos FID	Cat. Gasto	Previsto R\$	Executado R\$
PLACA DA IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	R\$ 4.983,96	R\$ 4.983,96	R\$ 4.983,96
LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	R\$ 11.707,12	R\$ 11.707,12	R\$ 11.707,12
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80M²	R\$ 7.092,00	R\$ 3.546,00	R\$ 0,00
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	R\$ 9.091,52	R\$ 4.545,76	R\$ 0,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	R\$ 4.572,01	R\$ 4.572,01	R\$ 3.886,21

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018			
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	R\$ 1.438,00	R\$ 1.438,00	R\$ 0,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 42.291,04	R\$ 42.291,04	R\$ 0,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021	R\$ 85.771,71	R\$ 12.253,10	R\$ 0,00
GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25MPA	R\$ 95.105,67	R\$ 13.586,52	R\$ 0,00
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	R\$ 63.551,95	R\$ 9.078,85	R\$ 0,00
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	R\$ 31.515,09	R\$ 4.502,15	R\$ 0,00
BASE DE BRITA GRADUADA	R\$ 65.144,23	R\$ 9.306,31	R\$ 0,00
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	R\$ 323.615,78	R\$ 46.230,82	R\$ 0,00
TINTA ACRÍLICA PARA FAIXAS DEMARCATORIAS	R\$ 21.506,40	R\$ 3.072,34	R\$ 0,00
ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO PATA DE VACA - H=2,00M	R\$ 8.627,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	R\$ 113,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	R\$ 37.610,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS	R\$ 2.300,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE	R\$ 12.654,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE P ISO DE CONCRETO EXISTENTE.			

AF_11/2021			
POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00M	R\$ 79.970,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	R\$ 5.094,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA SOLAR 120W ALL-IN-ONE REAL PARA POSTE COM 3.6000 LÚMENS	R\$ 70.209,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED SOLAR	R\$ 5.884,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 989.851,63	R\$ 171.113,98	R\$ 20.577,29

4) Comparativo entre as metas propostas no plano de trabalho e os resultados alcançados;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO		
	Meta	Executado
Execução de Obras	17,28%	2,07%
Aquisição de Equipamentos	0%	0%

Descrever os resultados já alcançados e incluir o relatório fotográfico (fotos coloridas) do desenvolvimento da obra.

No mês de março, a empresa deu continuidade aos serviços de terraplanagem; contudo, as condições climáticas, em razão do período chuvoso, prejudicaram o desenvolvimento da obra.

No mesmo período, foi realizada a supressão dos bambus existentes no trajeto da ciclovia.





Responsável pela elaboração: Marco Antonio Martins – Secretário adjunto – CAU/SP A189485-4



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

Nome do Projeto: Implantação de Ciclovia e Paisagismo - Avenida Hissagy Marubayashi

Período de Execução: 01/04/2026 a 30/04/2026

% Executado no Período: 2,07%

1. Descrever a finalidade do convênio e seus objetivos;

Implantar ciclovia com paisagismo em trecho urbano, promovendo mobilidade ativa, segurança viária e qualidade ambiental no entorno da Avenida Hissagy Marubayashi. O projeto integra o plano de requalificação viária do município.

2. As atividades desenvolvidas com recursos da contrapartida e as categorias de gastos;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO			
Recursos Próprios – Contrapartida	Cat. Gasto	Previsto R\$	Executado R\$
Assessoria	R\$70.687,49	R\$42.412,49	R\$ 42.412,49
	R\$70.687,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. As atividades desenvolvidas com recursos do FID e as categorias de gastos;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO			
Recursos FID	Cat. Gasto	Previsto R\$	Executado R\$
PLACA DA IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	R\$ 4.983,96	R\$ 4.983,96	R\$ 4.983,96
LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	R\$ 11.707,12	R\$ 11.707,12	R\$ 11.707,12

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80M²	R\$ 7.092,00	R\$ 7.092,00	R\$ 0,00
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	R\$ 9.091,52	R\$ 9.091,52	R\$ 0,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	R\$ 4.572,01	R\$ 4.572,01	R\$ 3.886,21
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	R\$ 1.438,00	R\$ 1.438,00	R\$ 0,00
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	R\$ 1.438,00	R\$ 1.438,00	R\$ 0,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 42.291,04	R\$ 42.291,04	R\$ 0,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021	R\$ 85.771,71	R\$ 24.506,80	R\$ 0,00
GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25MPA	R\$ 95.105,67	R\$ 27.173,04	R\$ 0,00
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	R\$ 63.551,95	R\$ 18.157,70	R\$ 0,00
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	R\$ 31.515,09	R\$ 9.004,30	R\$ 0,00
BASE DE BRITA GRADUADA	R\$ 65.144,23	R\$ 18.612,62	R\$ 0,00
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	R\$ 323.615,78	R\$ 92.461,64	R\$ 0,00
TINTA ACRÍLICA PARA FAIXAS DEMARCATORIAS	R\$ 21.506,40	R\$ 3.072,34	R\$ 0,00

ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO PATA DE VACA - H=2,00M	R\$ 8.627,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	R\$ 113,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	R\$ 37.610,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS	R\$ 2.300,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE	R\$ 12.654,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE P ISO DE CONCRETO EXISTENTE.			
AF_11/2021			
POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00M	R\$ 79.970,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	R\$ 5.094,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA SOLAR 120W ALL-IN-ONE REAL PARA POSTE COM 3.6000 LÚMENS	R\$ 70.209,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED SOLAR	R\$ 5.884,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 989.851,63	R\$ 275.602,09	R\$ 20.577,29

4. Comparativo entre as metas propostas no plano de trabalho e os resultados alcançados;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO

	Meta	Executado
Execução de Obras	27,84%	2,07%
Aquisição de Equipamentos	0%	0%

Descrever os resultados já alcançados e incluir o relatório fotográfico (fotos coloridas) do desenvolvimento da obra.

No mês de abril, a empresa deu continuidade aos serviços de terraplanagem e realizou a instalação das guias em todo o trajeto da obra.

Não houve evolução financeira, tendo em vista que a empresa não encaminhou a medição dos serviços executados. Ressalta-se que foi solicitado o envio da medição, como forma de demonstração do andamento da obra no relatório mensal; contudo, a empresa não apresentou a referida documentação.





Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio Martins, Secretário Adjunto**, em 08/05/2026, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0169559** e o código CRC **A7FDF88F**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00002884/2025-18

SEI nº 0169559

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

Nome do Projeto: Implantação de Ciclovia e Paisagismo - Avenida Hissagy Marubayashi

Período de Execução: 01/05/2026 a 31/05/2026

% Executado no Período: 2,07%

1. Descrever a finalidade do convênio e seus objetivos;

Implantar ciclovia com paisagismo em trecho urbano, promovendo mobilidade ativa, segurança viária e qualidade ambiental no entorno da Avenida Hissagy Marubayashi. O projeto integra o plano de requalificação viária do município.

2. As atividades desenvolvidas com recursos da contrapartida e as categorias de gastos;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO			
Recursos Próprios – Contrapartida	Cat. Gasto	Previsto R\$	Executado R\$
Assessoria	R\$70.687,49	R\$49.481,24	R\$ 42.412,49
	R\$70.687,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. As atividades desenvolvidas com recursos do FID e as categorias de gastos;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO			
Recursos FID	Cat. Gasto	Previsto R\$	Executado R\$
PLACA DA IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	R\$ 4.983,96	R\$ 4.983,96	R\$ 4.983,96
LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	R\$ 11.707,12	R\$ 11.707,12	R\$ 11.707,12

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80M²	R\$ 7.092,00	R\$ 7.092,00	R\$ 0,00
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	R\$ 9.091,52	R\$ 9.091,52	R\$ 0,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	R\$ 4.572,01	R\$ 4.572,01	R\$ 3.886,21
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	R\$ 1.438,00	R\$ 1.438,00	R\$ 0,00
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	R\$ 1.438,00	R\$ 1.438,00	R\$ 0,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 42.291,04	R\$ 42.291,04	R\$ 0,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021	R\$ 85.771,71	R\$ 24.506,80	R\$ 0,00
GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25MPA	R\$ 95.105,67	R\$ 95.105,67	R\$ 0,00
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	R\$ 63.551,95	R\$ 18.157,70	R\$ 0,00
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	R\$ 31.515,09	R\$ 9.004,30	R\$ 0,00
BASE DE BRITA GRADUADA	R\$ 65.144,23	R\$ 50.226,28	R\$ 0,00
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	R\$ 323.615,78	R\$ 92.461,64	R\$ 0,00
TINTA ACRÍLICA PARA FAIXAS DEMARCATORIAS	R\$ 21.506,40	R\$ 3.072,34	R\$ 0,00

	Meta	Executado
Execução de Obras	37,89%	2,07%
Aquisição de Equipamentos	0%	0%

Descrever os resultados já alcançados e incluir o relatório fotográfico (fotos coloridas) do desenvolvimento da obra.

No mês de maio, a empresa finalizou os serviços de terraplanagem , a camada foi devidamente compactada e umedecida, conforme previsto para a execução dos serviços.

Não houve evolução financeira, tendo em vista que a empresa não encaminhou a medição dos serviços executados. Ressalta-se que foi solicitado o envio da medição, como forma de demonstração do andamento da obra no relatório mensal; contudo, a empresa não apresentou a referida documentação.



LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80M²	R\$ 7.092,00	R\$ 7.092,00	R\$ 0,00
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	R\$ 9.091,52	R\$ 9.091,52	R\$ 0,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	R\$ 4.572,01	R\$ 4.572,01	R\$ 3.886,21
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	R\$ 1.438,00	R\$ 1.438,00	R\$ 0,00
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	R\$ 1.438,00	R\$ 1.438,00	R\$ 0,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 42.291,04	R\$ 42.291,04	R\$ 0,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021	R\$ 85.771,71	R\$ 24.506,80	R\$ 0,00
GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25MPA	R\$ 95.105,67	R\$ 95.105,67	R\$ 0,00
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	R\$ 63.551,95	R\$ 63.551,95	R\$ 0,00
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	R\$ 31.515,09	R\$ 31.515,09	R\$ 0,00
BASE DE BRITA GRADUADA	R\$ 65.144,23	R\$ 65.144,23	R\$ 0,00
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	R\$ 323.615,78	R\$ 323.615,78	R\$ 0,00
TINTA ACRÍLICA PARA FAIXAS DEMARCATORIAS	R\$ 21.506,40	R\$ 3.072,34	R\$ 0,00

ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO PATA DE VACA - H=2,00M	R\$ 8.627,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	R\$ 113,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	R\$ 37.610,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS	R\$ 2.300,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE	R\$ 12.654,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE P ISO DE CONCRETO EXISTENTE.			
AF_11/2021			
POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00M	R\$ 79.970,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	R\$ 5.094,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA SOLAR 120W ALL-IN-ONE REAL PARA POSTE COM 3.6000 LÚMENS	R\$ 70.209,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED SOLAR	R\$ 5.884,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 989.851,63	R\$ 589.579,22	R\$ 20.577,29

4. Comparativo entre as metas propostas no plano de trabalho e os resultados alcançados;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO



sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio Martins, Secretário Adjunto**, em 08/07/2026, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0192226** e o código CRC **3072A986**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00002884/2025-18

SEI nº 0192226

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80M²	R\$ 7.092,00	R\$ 7.092,00	R\$ 0,00
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	R\$ 9.091,52	R\$ 9.091,52	R\$ 0,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	R\$ 4.572,01	R\$ 4.572,01	R\$ 3.886,21
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	R\$ 1.438,00	R\$ 1.438,00	R\$ 0,00
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	R\$ 1.438,00	R\$ 1.438,00	R\$ 0,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 42.291,04	R\$ 42.291,04	R\$ 0,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021	R\$ 85.771,71	R\$ 24.506,80	R\$ 0,00
GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25MPA	R\$ 95.105,67	R\$ 95.105,67	R\$ 0,00
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	R\$ 63.551,95	R\$ 63.551,95	R\$ 0,00
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	R\$ 31.515,09	R\$ 31.515,09	R\$ 0,00
BASE DE BRITA GRADUADA	R\$ 65.144,23	R\$ 65.144,23	R\$ 0,00
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	R\$ 323.615,78	R\$ 323.615,78	R\$ 0,00
TINTA ACRÍLICA PARA FAIXAS DEMARCATORIAS	R\$ 21.506,40	R\$ 3.072,34	R\$ 0,00

ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO PATA DE VACA - H=2,00M	R\$ 8.627,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	R\$ 113,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	R\$ 37.610,32	R\$ 37,610,32	R\$ 0,00
CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS	R\$ 2.300,62	R\$ 2.300,62	R\$ 0,00
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE	R\$ 12.654,00	R\$ 12,654,00	R\$ 0,00
DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE P ISO DE CONCRETO EXISTENTE.			
AF_11/2021			
POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00M	R\$ 79.970,40	R\$ 70,970,40	R\$ 0,00
BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	R\$ 5.094,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA SOLAR 120W ALL-IN-ONE REAL PARA POSTE COM 3.6000 LÚMENS	R\$ 70.209,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED SOLAR	R\$ 5.884,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 989.851,63	R\$ 700.460,56	R\$ 20.577,29

4. Comparativo entre as metas propostas no plano de trabalho e os resultados alcançados;

Exemplo:

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAISAGISMO

	Meta	Executado
Execução de Obras	70,76%	2,07%
Aquisição de Equipamentos	0%	0%

Descrever os resultados já alcançados e incluir o relatório fotográfico (fotos coloridas) do desenvolvimento da obra.

No mês de julho, a empresa realizou testes na pista, os quais identificaram deformações. Em razão disso, estão sendo executados os reparos necessários para posterior aplicação da pavimentação asfáltica. O período também apresentou elevada ocorrência de chuvas, o que contribuiu para o atraso na execução da obra.

Não houve evolução financeira, tendo em vista que a empresa não encaminhou a medição dos serviços executados. Ressalta-se que foi solicitado o envio da medição, como forma de demonstração do andamento da obra no relatório mensal; contudo, a empresa não apresentou a referida documentação.





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0203482** e o código CRC **10F8C38A**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00002884/2025-18

SEI nº 0203482

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25671/25671_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Assessoria de Departamento

DESPACHO

Nº do Processo: 3535507.414.00008354/2026-64

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

Assunto: Requerimento(s) nº 209, 213 e 214 de 2026 - SO

RESPOSTA PARA REQUERIMENTO DE SESSÃO 214/2026

1. Quais são todas as obras públicas contratadas com empresas terceirizadas que se encontram em execução no município na presente data, discriminando o valor global de cada contrato e a respectiva origem dos recursos (recursos próprios, emendas parlamentares ou convênios), bem como o prazo de execução de cada uma? Relacionar.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MCMV FNHIS SUB 50

A obra de **construção de 90 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida** encontra-se em execução, sob responsabilidade da empresa **Credlar Empreendimentos Imobiliários Ltda.**, inscrita no CNPJ nº **07.095.113/0001-67**, contratada por meio da **Concorrência Eletrônica nº 003/2026**, Processo nº **006/26** e **Contrato nº 007/2026**.

O valor global contratado é de **R\$ 12.301.996,80**. A obra é executada com recursos provenientes de **repasse federais e recursos do Tesouro Municipal**. Do valor contratado, **R\$ 6.266.812,23** correspondem ao **TC 74543/2025 (50 unidades habitacionais) – recursos federais**; **R\$ 5.460.000,00** correspondem ao **TC 990518/2025 (40 unidades habitacionais) – recursos federais**; e **R\$ 585.185,51** correspondem à **contrapartida do Tesouro Municipal**, vinculada ao **TC 990518/2025**.

O prazo de vigência da contratação é de **20 meses**, contados da publicação no PNCP.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

A obra de **reforma e ampliação do prédio do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS** encontra-se em execução, sob responsabilidade da empresa **CONSTRUTORA ARAÚJO DE PARAGUAÇU LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **27.411.315/0001-88**, contratada por meio da **Concorrência Eletrônica nº 002/2025**, Processo Administrativo nº **043/2025** e **Contrato nº 011/2025**. O regime de execução é de empreitada por preço global, com fornecimento de materiais e prestação de serviços associados.

O valor global atualizado da contratação é de **R\$ 955.544,60**, considerando os termos aditivos formalizados. A contratação originalmente foi firmada no valor de **R\$ 749.000,00**, sendo **R\$ 298.054,48** provenientes de **recursos próprios do Município** e **R\$ 450.945,52** provenientes de **recursos estaduais**. Posteriormente, foram formalizados aditivos para adequação e acréscimo de serviços, resultando no valor global atualizado de **R\$ 955.544,60**.

O prazo de vigência da contratação é de **9 meses**, contados da assinatura do contrato, ocorrida em **17 de abril de 2025**, ressalvadas eventuais alterações ou prorrogações formalmente autorizadas.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE CONJUNTO HABITACIONAL DONA LINA LEUZZI

A obra de **construção de Creche Padrão FDE, no Conjunto Habitacional Dona Lina Leuzzi**, encontra-se em execução, sob responsabilidade da empresa **Amaral Engenharia, Construção e Comércio Ltda.**, inscrita no CNPJ nº **34.223.533/0001-54**, contratada por meio da **Concorrência Eletrônica nº 004/2025**, Processo nº **140/25** e **Contrato nº 033/2025**.

O valor global contratado é de **R\$ 3.695.000,00**. A obra é executada com recursos provenientes de **Recurso Estadual**, conforme dotação orçamentária indicada no contrato.

O prazo de vigência da contratação é de **12 meses**, contados da **data da Ordem de Início de Serviço**, sendo os pagamentos realizados conforme o plano de trabalho da **FDE**.

2. Quem são os engenheiros ou fiscais de contrato nomeados pela Prefeitura para acompanhar tecnicamente a execução de cada uma dessas obras contratadas? Relacionar por responsável

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MCMV FNHIS SUB 50

- **Mylene Belli**, Engenheira Civil, CREA nº 5071006880;
- **Edi José da Silva**, arquiteto e urbanista, CAU/SP nº A189488-9 e fiscal de contrato.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS

- **Mylene Belli**, Engenheira Civil, CREA nº 5071006880;

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE CONJUNTO HABITACIONAL DONA LINA LEUZZI

- **Mylene Belli**, Engenheira Civil, CREA nº 5071006880;
- **Edi José da Silva**, arquiteto e urbanista, CAU/SP nº A189488-9 e fiscal de contrato.

3. Houve a emissão de boletins de medição e a efetivação de pagamentos recentes para essas empresas? Em caso afirmativo, qual é o percentual físico executado e o percentual financeiro pago de cada obra em andamento até o momento? Relacionar por obra com porcentagens solicitadas

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MCMV FNHIS SUB 50

Até o momento não foram elaboradas medições da obra;

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS

Até o momento foram elaboradas nove medições da ampliação.

- Valor acumulado medido: **R\$ 362.533,81**;
- Percentual acumulado de execução física: **99,27%**;

Até o momento foram elaboradas nove medições da reforma.

- Valor acumulado medido: **R\$ 556.884,46;**
- Percentual acumulado de execução física: **94,33%;**

Obs: falta a instalação fotovoltaica.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE CONJUNTO HABITACIONAL DONA LINA LEUZZI

Até o momento foram elaboradas quatro medições da obra;

- Valor acumulado medido: **R\$ 1.117.786,86;**
- Percentual acumulado de execução física: **39,00%;**

4. Alguma das obras contratadas apresenta atraso em relação ao cronograma inicial estabelecido em contrato? Se sim, quais foram as justificativas apresentadas pelas empresas? Quais penalidades foram aplicadas pela atual gestão pelas irregularidades? Relacionar por obra com o nome de cada empresa responsável.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MCMV FNHIS SUB 50

Houve contrapartida do município em terraplanagem, ocasionando atrasos no início da obra.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

Sim, no entanto a obra se encontra concluída esperando apenas a instalação do aparelho fotovoltaico para a entrega definitiva.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE CONJUNTO HABITACIONAL DONA LINA LEUZZI

Sim, houve solicitação de prorrogação de prazo pela empresa que está sobre análise do departamento jurídico.

5. A administração municipal possui relatórios de vistoria técnica atualizados para cada um desses canteiros de obras? Em caso afirmativo, requer-se o envio de cópias dos referidos documentos. Em caso negativo, justifique a falta de acompanhamento documentado.

Em anexos relatórios referente a:

- **CONSTRUÇÃO DE 90 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MCMV FNHIS SUB 50;**
- **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS;**
- **CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE CONJUNTO HABITACIONAL DONA LINA LEUZZI.**

6. Existem obras no Município que tiveram abandono ou rescisão contratual e que necessitam ou já tiveram nova licitação providenciada? Relacionar as obras, o motivo do abandono e informar se houve ou quando haverá novo processo licitatório.

Sim. A reforma da EMEF Antônio Mazzei teve o contrato rescindido, sendo necessária nova licitação para a conclusão dos serviços remanescentes. Considerando que parte significativa das adequações pendentes está relacionada à segurança contra incêndio, a continuidade da reforma será integrada ao processo de adequação das escolas municipais previsto no TAC para regularização junto ao Corpo de Bombeiros,

sendo posteriormente adotadas as providências necessárias para a contratação e execução dos serviços.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

Hellen Isabella do Nascimento

Arquiteta

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Hellen Isabella do Nascimento, Arquiteto**, em 14/08/2026, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0205725** e o código CRC **1E71338F**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00008354/2026-64

SEI nº 0205725

Resposta do Executivo 195/2026 Protocolo 44110 Envio em 18/08/2026 09:27:01
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2026/25671/25671_original.pdf

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 1ª MEDIÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE

	IMAGEM 01 Data: 05/12/2025 Obs.:
	IMAGEM 02 Data: 05/12/2025 Obs.:
	IMAGEM 03 Data: 05/12/2025 Obs.:



Imagem 04 – Sondagem

IMAGEM 04

Data: 05/12/2025

Obs.:



magem 05 – Caixaria para blocos

IMAGEM 05

Data: 05/12/2025

Obs.:



magem 06 – Gabarito, caixaria para blocos e abertura de vala para baldrame

IMAGEM 06

Data: 05/12/2025

Obs.:



imagem 07 – Estacas

IMAGEM 07

Data: 05/12/2025

Obs.:



Mylena Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 2ª MEDIÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE



imagem 01 – Aterro e viga baldrame



Imagem 02 – Forma de madeira



Imagem 03 – Forma de madeiro, ferragem e brita



Imagem 04 – Concretagem

IMAGEM 04

Data: 20/01/2026

Obs.:



Imagem 05 – Concretagem

IMAGEM 05

Data: 20/01/2026

Obs.:



Imagem 06 – Bloco de embasamento

IMAGEM 06

Data: 28/01/2026

Obs.:



imagem 07 – Bloco de embasamento e impermeabilizante

IMAGE 07

Data: 28/01/2026

Obs.:



imagem 08 – Bloco de embasamento e impermeabilizante

IMAGEM 08

Data: 28/01/2026

Obs.:

gov.br Documento assinado digitalmente
MYLENA BELLI
Data: 28/01/2026 11:04:28-0300
Verifique em: <https://valida16.gov.br>

**Mylena Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE
DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE

São Paulo – SP

Rua Irmãos Leme, 97 – Tatuapé
comercial@amaraleng.com.br

(11) 2098 – 2637**amaraleng.com.br****CNPJ: 34.223.533/0001-54****Inscrição Estadual: 126.400.451.117**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE
DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE

São Paulo – SP

Rua Irmãos Leme, 97 – Tatuapé
comercial@amaraleng.com.br

(11) 2098 – 2637

amaraleng.com.br

CNPJ: **34.223.533/0001-54**

Inscrição Estadual: **126.400.451.117**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE
DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE

São Paulo – SP

Rua Irmãos Leme, 97 – Tatuapé
comercial@amaraleng.com.br

(11) 2098 – 2637**amaraleng.com.br****CNPJ: 34.223.533/0001-54****Inscrição Estadual: 126.400.451.117**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE
DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE

São Paulo – SP

Rua Irmãos Leme, 97 – Tatuapé
comercial@amaraleng.com.br

(11) 2098 – 2637**amaraleng.com.br****CNPJ: 34.223.533/0001-54****Inscrição Estadual: 126.400.451.117**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE
DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE

São Paulo – SP

Rua Irmãos Leme, 97 – Tatuapé
comercial@amaraleng.com.br

(11) 2098 – 2637**amaraleng.com.br****CNPJ: 34.223.533/0001-54****Inscrição Estadual: 126.400.451.117**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE
DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE

São Paulo – SP

Rua Irmãos Leme, 97 – Tatuapé
comercial@amaraleng.com.br

(11) 2098 – 2637**amaraleng.com.br****CNPJ: 34.223.533/0001-54****Inscrição Estadual: 126.400.451.117**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 1ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL



Imagem 01 – Construção do muro

IMAGEM 01
Item 03 e 04
Data: 12/06/2025
Obs.:



Imagem 02 – Construção do muro

IMAGEM 02
Item 03 e 04
Data: 12/06/2025
Obs.:



Imagem 03 – Retirada de portas e batentes

IMAGEM 03
Item 2.6 e 2.7
Data: 13/06/2025
Obs.:

	IMAGEM 04 Item 02.10 Data: 13/06/2025 Obs.:
	IMAGEM 05 Item 02.10 Data: 13/06/2025 Obs.:
	IMAGEM 06 Item 02.01 Data: 13/06/2025 Obs.:
	IMAGEM 07 Item 02.06 Data: 13/06/2025 Obs.:



Imagem 08 – Retirada de aparelho sanitário

IMAGEM 08
Item 02.09
Data: 13/06/2025
Obs.:



Imagem 09 – Demolição de revestimento cerâmico e alvenaria

IMAGEM 09
Item 02.01 e 2.10
Data: 13/06/2025
Obs.:



Imagem 10 – Demolição de alvenaria

IMAGEM 10
Item 02.01
Data: 13/06/2025
Obs.:



Imagem 11 – Construção do muro

IMAGEM 11
Item 03 e 04
Data: 13/06/2025
Obs.:



Imagem 12 – Retirada de ferro

IMAGEM 12
Item 02.12
Data: 13/06/2025
Obs.:



Imagem 13 – Muro de divisa e ferragens

IMAGEM 13
Item 03 e 04
Data: 17/06/2025
Obs.:



Imagem 14 – Muro de divisa e ferragens

IMAGEM 14
Item 03 e 04
Data: 17/06/2025
Obs.:



Mylene Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 2ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

 Imagem 01 – Retirada das telhas de barro	IMAGEM 01 Item 2.11 Data: 14/07/2025 Obs.:
 Imagem 02 – Compactação mecânica do solo	IMAGEM 02 Item 6.1 Data: 14/07/2025 Obs.:
 Imagem 03 – Concreto para nivelamento do piso	IMAGEM 03 Item 6.3 e 6.5 Data: 14/07/2025 Obs.:



Imagem 04 – Concreto para nivelamento do piso

IMAGEM 04
Item 6.3 e 6.5
Data: 14/07/2025
Obs.:



Imagem 05 – Demolição de alvenaria

IMAGEM 05
Item 02.01
Data: 14/07/2025
Obs.:



Imagem 06 – Demolição de alvenaria

IMAGEM 06
Item 02.01
Data: 14/07/2025
Obs.:



Imagem 07 – Demolição de alvenaria

IMAGEM 07
Item 02.01
Data: 14/07/2025
Obs.:



Imagem 08 – Demolição de revestimento cerâmico

IMAGEM 08
Item 02.10
Data: 14/07/2025
Obs.:



Imagem 09 – Concreto para nivelamento do piso

IMAGEM 09
Item 6.3 e 6.5
Data: 14/07/2025
Obs.:



Imagem 10 – Concreto para nivelamento do piso

IMAGEM 10
Item 6.3 e 6.5
Data: 14/07/2025
Obs.:

Documento assinado digitalmente
MYLENA BELLI
 Data: 15/07/2025 11:45:38-0300
 Verifique em: <https://validar.jf.gov.br>

Mylena Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 3ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

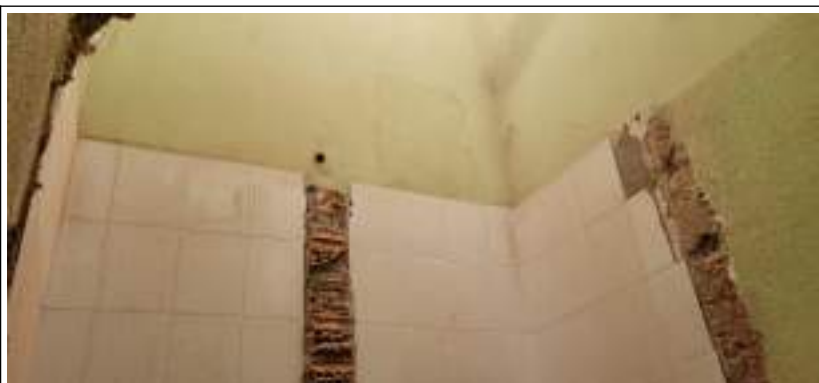


Imagem 01 – Demolição de parede

IMAGEM 01
Item 2.1
Data: 06/08/2025
Obs.:



Imagem 02 – Retirada de pisos

IMAGEM 02
Item 2.10
Data: 06/08/2025
Obs.:



Imagem 03 – Contrapiso e nivelamento

IMAGEM 03
Item 6.3
Data: 06/08/2025
Obs.:



Imagem 04 – Reboco

IMAGEM 04
Item 4.2, 4.3 e 4.4
Data: 06/08/2025
Obs.:



Imagem 05 – Construção de alvenaria

IMAGEM 05
Item 4.1
Data: 06/08/2025
Obs.:



Imagem 06 – Concreto para nivelamento de piso

IMAGEM 06
Item 6.3
Data: 06/08/2025
Obs.:



Imagem 07 – Alvenaria

IMAGEM 07
Item 4.1
Data: 06/08/2025
Obs.:

	IMAGEM 8 Item 4.2, 4.3 e 4.4 Data: 06/08/2025 Obs.:
Imagem 8 – Reboco	

	IMAGEM 9 Item 4.2, 4.3 Data: 28/07/2025 Obs.:
Imagem 9 – Chapisco e Emboço	

	IMAGEM 10 Item 4.2 Data: 28/07/2025 Obs.:
Imagem 10 – Chapisco	



Imagem 11 – Retirada de esquadria metálica

IMAGEM 11
Item 2.2
Data: 28/07/2025
Obs.:



Mylena Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 4ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL



Imagem 01 – Calçada

IMAGEM 01

Data: 25/08/2025

Obs.:



Imagem 02 – Calçada e guia

IMAGEM 02

Data: 25/08/2025

Obs.:



Imagem 03 – Calçada e guia

IMAGEM 03

Data: 25/08/2025

Obs.:

 Imagem 04 – Telhado e ripa	IMAGEM 04 Data: 25/08/2025 Obs.:
---	--

 Imagem 05 – Telhado e ripa	IMAGEM 05 Data: 25/08/2025 Obs.:
--	--

 Imagem 06 – Reboco, batente e porta	IMAGEM 06 Data: 25/08/2025 Obs.:
--	--



Imagem 07 – Batente e porta

IMAGEM 07

Data: 25/08/2025

Obs.:



Imagem 8 – Batente

IMAGEM 8

Data: 25/08/2025

Obs.:



Imagem 9 – Alvenaria, Chapisco e Emboço

IMAGEM 9

Data: 25/08/2025

Obs.:



Imagem 10 – Telhado, ripa e testeira

IMAGEM 10

Data: 25/08/2025

Obs.:



Imagem 11 – Rampa de acessibilidade

IMAGEM 11

Data: 25/08/2025

Obs.:




Imagem 11 – Porta de aço

IMAGEM 11

Data: 25/08/2025

Obs.:



Mylene Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 5ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

	IMAGEM 01 Data: 02/10/2025 Obs.:
	IMAGEM 02 Data: 02/10/2025 Obs.:
	IMAGEM 03 Data: 02/10/2025 Obs.:

imagem 01 – Gradil

Imagem 02 – Gradil, pilar metálico, contrapiso

Imagem 03 – Soleira



IMAGEM 04

Data: 02/10/2025

Obs.:

Imagem 04 – Massa corrida e bancada



IMAGEM 05

Data: 02/10/2025

Obs.:

Imagem 05 – Janela e pingadeira



IMAGEM 06

Data: 02/10/2025

Obs.:

Imagem 06 – Janelas, entrada para ar condicionado, fundo preparador nas paredes



magem 07 – Quadro de distribuição e tubo flexível

IMAGEM 07

Data: 02/10/2025

Obs.:



magem 8 – Bancada com cuba inox

IMAGEM 8

Data: 02/10/2025

Obs.:



imagem 9 – Retirada do forro PVC

IMAGEM 9

Data: 02/10/2025

Obs.:



imagem 10 – Massa corrida

IMAGEM 10

Data: 02/10/2025

Obs.:



gem 11 – Placa da obra

Ima IMAGEM 11

Data: 02/10/2025

Obs.:



Documento assinado digitalmente
MYLENA BELLI
Data: 02/10/2025 14:53:07-0800
Verifique em <https://valida16.gov.br>

Mylene Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 6ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL





Imagem 04 – Instalação de esgoto

IMAGEM 04

Data: 05/12/2025

Obs.:




magem 05 – Instalação elétrica

IMAGEM 05

Data: 05/12/2025

Obs.:

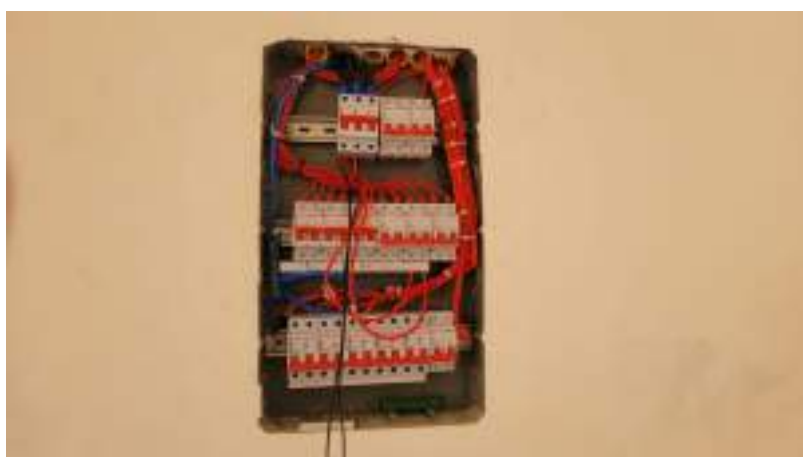

magem 06 – Quadro de energia

IMAGEM 06

Data: 05/12/2025

Obs.:



magem 07 – Banheiro, porta e batente

IMAGEM 07

Data: 05/12/2025

Obs.:



magem 8 – Instalação de água fria

IMAGEM 8

Data: 05/12/2025

Obs.:



magem 9 – Bancada, pia e massa corrida

IMAGEM 9

Data: 05/12/2025

Obs.:

	IMAGEM 10 Data: 05/12/2025 Obs.:
---	--

magem 10 – Instalação elétrica

	IMAGEM 11 Data: 05/12/2025 Obs.:
--	--

magem 11 – Retirada de Instalação elétrica antiga


 Documento assinado digitalmente
MYLENA BELLI
 Data: 09/12/2025 09:28:37-0300
 verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Mylene Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 7ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL





Imagem 04 – Cuba, pia, torneira e pedra

IMAGEM 04

Data: 23/03/2026

Obs.:



Imagem 05 – Forro PVC

IMAGEM 05

Data: 23/03/2026

Obs.:



Mylena Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 8ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL



Imagem 01 – Piso

IMAGEM 01

Data: 23/04/2026

Obs.:



Imagem 02 – Piso e rodapé

IMAGEM 02

Data: 23/04/2026

Obs.:

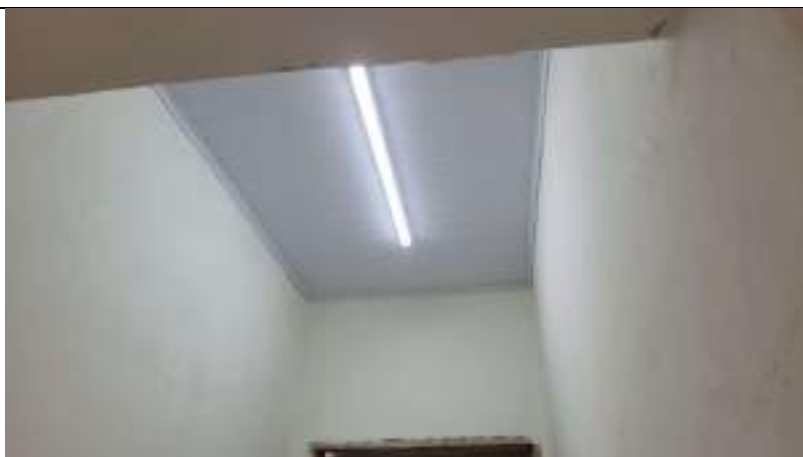


Imagem 03 – Forro pvc e iluminação

IMAGEM 03

Data: 23/04/2026

Obs.:



Imagem 04 – Pintura no teto e iluminação

IMAGEM 04

Data: 23/04/2026

Obs.:



Imagem 05 – Pintura, pia, torneira, piso e rodapé

IMAGEM 05

Data: 23/04/2026

Obs.:



Imagem 06 – Revestimento

IMAGEM 06

Data: 23/04/2026

Obs.:

gov.br
Documento assinado digitalmente
MYLENA BELLI
Data: 23/04/2026 17:34:12 -0300
verifique em <https://validar.jf.gov.br/>

Mylene Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 9ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

	IMAGEM 01 Data: 03/07/2026 Obs.:
---	--

Imagem 01 – Extintor

	IMAGEM 02 Data: 03/07/2026 Obs.:
--	--

Imagem 02 – Placa



Imagem 03 – Placas

IMAGEM 03

Data: 03/07/2026

Obs.:



Imagem 04 – Placa

IMAGEM 04

Data: 03/07/2026

Obs.:



Imagem 05 – Pintura, gradil, portão, corrimão

IMAGEM 05

Data: 03/07/2026

Obs.:



Imagem 06 – Gradil, portão, corrimão

IMAGEM 06

Data: 03/07/2026

Obs.:



Imagem 07 – Corrimão

IMAGEM 07

Data: 03/07/2026

Obs.:



Imagem 08 – Corrimão

IMAGEM 08

Data: 03/07/2026

Obs.:



Imagem 09 – Banheiro PNE

IMAGEM 09

Data: 03/07/2026

Obs.:



Imagem 10 – Banheiro

IMAGEM 10

Data: 03/07/2026

Obs.:



Imagem 11 – Pintura e instalações

IMAGEM 11

Data: 03/07/2026

Obs.:



Imagem 12 – Pintura e telhado

IMAGEM 12

Data: 03/07/2026

Obs.:



IMAGEM 13

Data: 03/07/2026

Obs.:

Imagem 13 – Pintura e grade



IMAGEM 14

Data: 03/07/2026

Obs.:

Imagem 14 – Pintura e grade



Imagem 15 – Pintura e grade

IMAGEM 15

Data: 03/07/2026

Obs.:



Imagem 16 – Pia, cuba, granito e grade

IMAGEM 16

Data: 03/07/2026

Obs.:




Imagem 17 – Placa da obra

IMAGEM 17

Data: 03/07/2026

Obs.:



Mylene Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 1ª MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL



Imagem 01 – Locação

IMAGEM 01
Data: 15/05/2025
Obs.:



Imagem 02 – Locação

IMAGEM 02
Data: 15/05/2025
Obs.:



Imagem 03 – Baldrame, ferragem dos pilares e alvenaria

IMAGEM 03
Data: 13/06/2025
Obs.:



Imagem 04 – Baldrame, ferragem dos pilares e alvenaria

IMAGEM 04
Data: 13/06/2025
Obs.:



Imagem 05 – Canaleta para verga

IMAGEM 05
Data: 17/06/2025
Obs.:



IMAGEM 06
Data: 17/06/2025
Obs.:

Data: 17/06/2025

Obs.:



**Mylena Belli
Engenhaira Civil
CREA 5071006880**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 2ª MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL



Imagem 01 – Concretagem da laje

IMAGEM 01

Data: 11/07/2025

Obs.:



Imagem 02 – Instalação da laje

IMAGEM 02

Data: 11/07/2025

Obs.:



Imagem 03 – Instalação da laje

IMAGEM 03
Data: 11/07/2025
Obs.:



Imagem 04 – Alvenaria, laje e tubo flexível

IMAGEM 04
Data: 11/07/2025
Obs.:



Imagem 05 – Instalação da laje

IMAGEM 05
Data: 11/07/2025
Obs.:



Imagem 06 – Alvenaria e chapisco

IMAGEM 06
Data: 11/07/2025
Obs.:



Imagem 07 – Alvenaria e tubo flexível

IMAGEM 07
Data: 11/07/2025
Obs.:



Mylene Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 3ª MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

 Imagem 01 – Alvenaria e chapisco	IMAGEM 01 Data: 06/08/2025 Obs.:
 Imagem 02 – Chapisco	IMAGEM 02 Data: 06/08/2025 Obs.:
 Imagem 03 – Chapisco e tubo PVC flexível	IMAGEM 03 Data: 06/08/2025 Obs.:



Imagem 04 – Chapisco e tubo PVC flexível

IMAGEM 04
Data: 06/08/2025
Obs.:



Imagem 05 – Contrapiso

IMAGEM 05
Data: 06/08/2025
Obs.:



Imagem 06 – Tubo PVC flexível e chapisco

IMAGEM 06
Data: 06/08/2025
Obs.:



Imagem 07 – Contrapiso e chapisco

IMAGEM 07
Data: 06/08/2025
Obs.:



Imagem 08 – Contrapiso e chapisco

IMAGEM 08
Data: 06/08/2025
Obs.:



Imagem 09 – Contrapiso, chapisco e reboco

IMAGEM 09
Data: 06/08/2025
Obs.:



Imagem 10 – Contrapiso, chapisco e reboco

IMAGEM 10
Data: 06/08/2025
Obs.:

Documento assinado digitalmente
MYLENA BELLI
 Data: 08/08/2025 14:47:31-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Mylene Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 4ª MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL



Imagem 01 – Malha para laje

IMAGEM 01
Data: 11/07/2025
Obs.:



Imagem 02 – Verga e contraverga em ceramica

IMAGEM 02
Data: 12/06/2025
Obs.:



Imagem 03 – Verga e contraverga em cerâmica

IMAGEM 03

Data: 17/06/2025

Obs.:



Imagem 04 – Tubo PVC para esgoto

IMAGEM 04

Data: 25/08/2025

Obs.:



Imagem 05 – Portão basculante

IMAGEM 05

Data: 25/08/2025

Obs.:



**Mylena Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 5ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

	IMAGEM 01 Data: 02/10/2025 Obs.:
magem 01 – Gradil	

	IMAGEM 02 Data: 02/10/2025 Obs.:
Imagem 02 – Gradil, pilar metálico, contrapiso	

	IMAGEM 03 Data: 02/10/2025 Obs.:
Imagem 03 – Soleira	



IMAGEM 04

Data: 02/10/2025

Obs.:

Imagem 04 – Massa corrida e bancada



IMAGEM 05

Data: 02/10/2025

Obs.:

Imagem 05 – Janela e pingadeira



IMAGEM 06

Data: 02/10/2025

Obs.:

Imagem 06 – Janelas, entrada para ar condicionado, fundo preparador nas paredes



imagem 07 – Quadro de distribuição e tubo flexível

IMAGEM 07

Data: 02/10/2025

Obs.:



imagem 8 – Bancada com cuba inox

IMAGEM 8

Data: 02/10/2025

Obs.:



imagem 9 – Retirada do forro PVC

IMAGEM 9

Data: 02/10/2025

Obs.:



imagem 10 – Massa corrida

IMAGEM 10

Data: 02/10/2025

Obs.:



gem 11 – Placa da obra

Ima IMAGEM 11

Data: 02/10/2025

Obs.:



**Mylena Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 6ª MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

	IMAGEM 01 Data: 05/12/2025 Obs.:
Imagem 01 – Tubulação de água fria e esgoto	

	IMAGEM 02 Data: 05/12/2025 Obs.:
Imagem 02 – Tubulação de água fria e esgoto	



Imagem 03 – Tubulação de água fria e esgoto

IMAGEM 03
Data: 05/12/2025
Obs.:



Imagem 04 – Tubulação de água fria

IMAGEM 04
Data: 05/12/2025
Obs.:



Imagem 05 – Telha metálica

IMAGEM 05
Data: 05/12/2025
Obs.:



Imagem 06 – Caixa d'água

IMAGEM 06
Data: 05/12/2025
Obs.:



Imagem 07 – Portão metálico

IMAGEM 07
Data: 05/12/2025
Obs.:



Imagem 08 – Quadro de energia

IMAGEM 08
Data: 05/12/2025
Obs.:



IMAGEM 09
Data: 04/12/2025
Obs.:

Imagem 09 – Estrutura metálica do telhado



Mylena Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 7ª MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL



Imagem 01 – Janelas e pintura

IMAGEM 01
Data: 23/03/2026
Obs.:



magem 02 – Massa corrida e janela

IMAGEM 02
Data: 23/03/2026
Obs.:



Imagem 03 – Cuba, Torneira, pedra, instalação hidráulica

IMAGEM 03
Data: 23/03/2026
Obs.:



Imagem 04 – Cobertura metálica

IMAGEM 04
Data: 23/03/2026
Obs.:



Imagem 05 – Porta de madeira

IMAGEM 05
Data: 23/03/2026
Obs.:



Imagem 06 – Massa corrida e pintura

IMAGEM 06
Data: 23/03/2026
Obs.:



Imagem 07 – Porcelanato, massa corrida e instalação elétrica

IMAGEM 07
Data: 23/03/2026
Obs.:



Imagem 08 – Porta de saída de emergencia

IMAGEM 08
Data: 23/03/2026
Obs.:



Mylene Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 8ª MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL



Imagem 01 – Pintura no teto e iluminação

IMAGEM 01
Data: 24/04/2026
Obs.:

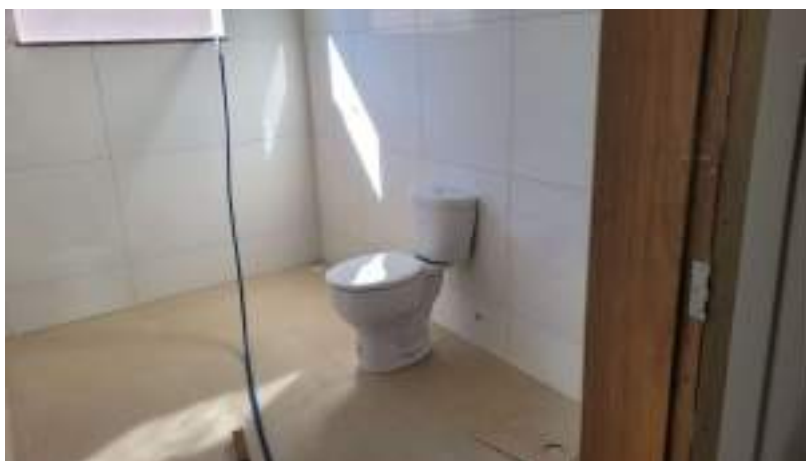


Imagem 02 – Revestimento cerâmico

IMAGEM 02
Data: 24/04/2026
Obs.:



Imagem 03 – Bancada

IMAGEM 03
Data: 24/04/2026
Obs.:



Imagem 04 – Revestimento

IMAGEM 04
Data: 24/04/2026
Obs.:



Imagem 05 – Casa de gás

IMAGEM 05
Data: 24/04/2026
Obs.:



Imagem 06 – Pintura em teto e iluminação

IMAGEM 06
Data: 24/04/2026
Obs.:

Documento assinado digitalmente
MYLENA BELLI
 Data: 27/04/2026 17:34:12-0800
 Verifique em <https://valida.jf.gov.br>

Mylena Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA 9ª MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL



Imagem 01 – Placa

IMAGEM 01

Data: 03/07/2026

Obs.:



Imagem 02 – Extintor

IMAGEM 02

Data: 03/07/2026

Obs.:



Imagem 03 – Extintor

IMAGE 03

Data: 03/07/2026

Obs.:



Imagem 04 – Revestimento, bacia sanitária e cuba

IMAGE 04

Data: 03/07/2026

Obs.:



Imagem 05 – Tanque

IMAGEM 05
Data: 03/07/2026
Obs.:



Imagem 06 – Pintura, revestimento e granito

IMAGEM 06
Data: 03/07/2026
Obs.:



Imagem 07 – Pintura, revestimento e granito

IMAGEM 07
Data: 03/07/2026
Obs.:



Imagem 08 – Pintura, gesso e iluminação

IMAGEM 08
Data: 03/07/2026
Obs.:



Imagem 09 – Banheiro PNE

IMAGEM 09
Data: 03/07/2026
Obs.:



Imagem 10 – Banheiro PNE

IMAGEM 10
Data: 03/07/2026
Obs.:



Imagem 11 – Banheiro PNE

IMAGEM 11
Data: 03/07/2026
Obs.:



Imagem 12 – Perfil metalico na porta

IMAGEM 12
Data: 03/07/2026
Obs.:

Documento assinado digitalmente
MYLENA BELLI
 Data: 04/07/2026 10:09:51-0800
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br/>

Mylena Belli
Engenheira Civil
CREA 5071006880

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MEDIÇÃO - 001

À GIHAB: FNHIS PARAGUAÇU PAULISTA - SP (50 UHS)

OBRA/SERVIÇO: ANÁLISE DE ENGENHARIA DO
EMPREENDIMENTO - FNHIS PARAGUAÇU PAULISTA-SP

REFERENTE: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS
EXECUTADOS NO PERÍODO

EMPRESA EXECUTORA: CREDLAR EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ: 07.095.113/0001-67

DATA DA VISTORIA: 17/06/2026



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS



LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024



LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024



LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024**



LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024



**LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024**



**LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024**



IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE APOIO AO CANTEIRO DE OBRAS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES INICIAIS DE MOBILIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.



LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024



LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024



LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024

Pedrinhas Paulista - SP, 17 de junho de 2025.

Desta forma, declaramos a veracidade das informações que seguem e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

CREDLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 07.095.113/0001-67

Rua Rio de Janeiro, 33 - Boqueirão - Praia Grande / SP - CEP: 11700-050

Telefone: (13) 3596-6988

www.credlarconstrutora.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Assessoria em Gestão de Licitações

DESPACHO

Nº do Processo: 3535507.414.00008354/2026-64

Interessado: Gabinete do Prefeito

Assunto: Requerimento(s) nº 209, 213 e 214 de 2026 - SO

RELAÇÃO DE RESCISÕES

Contrato nº 023/2024

Contratado: RC DOS SANTOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS INTERVENÇÃO E MELHORAIS NO PARQUE AQUÁTICO PREF. BENEDICTO BENÍCIO.

Multa: R\$ 577.500,00 (Quinhentos e setenta e sete mil e quinhentos reais).

Situação atual: Aguardando pedido nova licitação

Contrato nº 019/2024

Contratado: RC DOS SANTOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO C.H. DONA LINA LEUZZI.

Multa: R\$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil) reais.

Situação atual: Aguardando pedido nova licitação

Contrato nº 029/2023

Contratado: Obracri Ltda. EPP

Objeto: Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para intervenções e melhorias para intervenções e melhorias no Centro de Convergência Turístico

Multa: R\$ 365.201,11, (Trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e um real e onze centavos).

Situação atual: Já foi realizada nova licitação

